




Phasage général

Août 2023

PHASAGE GÉNÉRAL


Présentation de la ZAC – Repérage des Ilots et nouveaux espaces publics

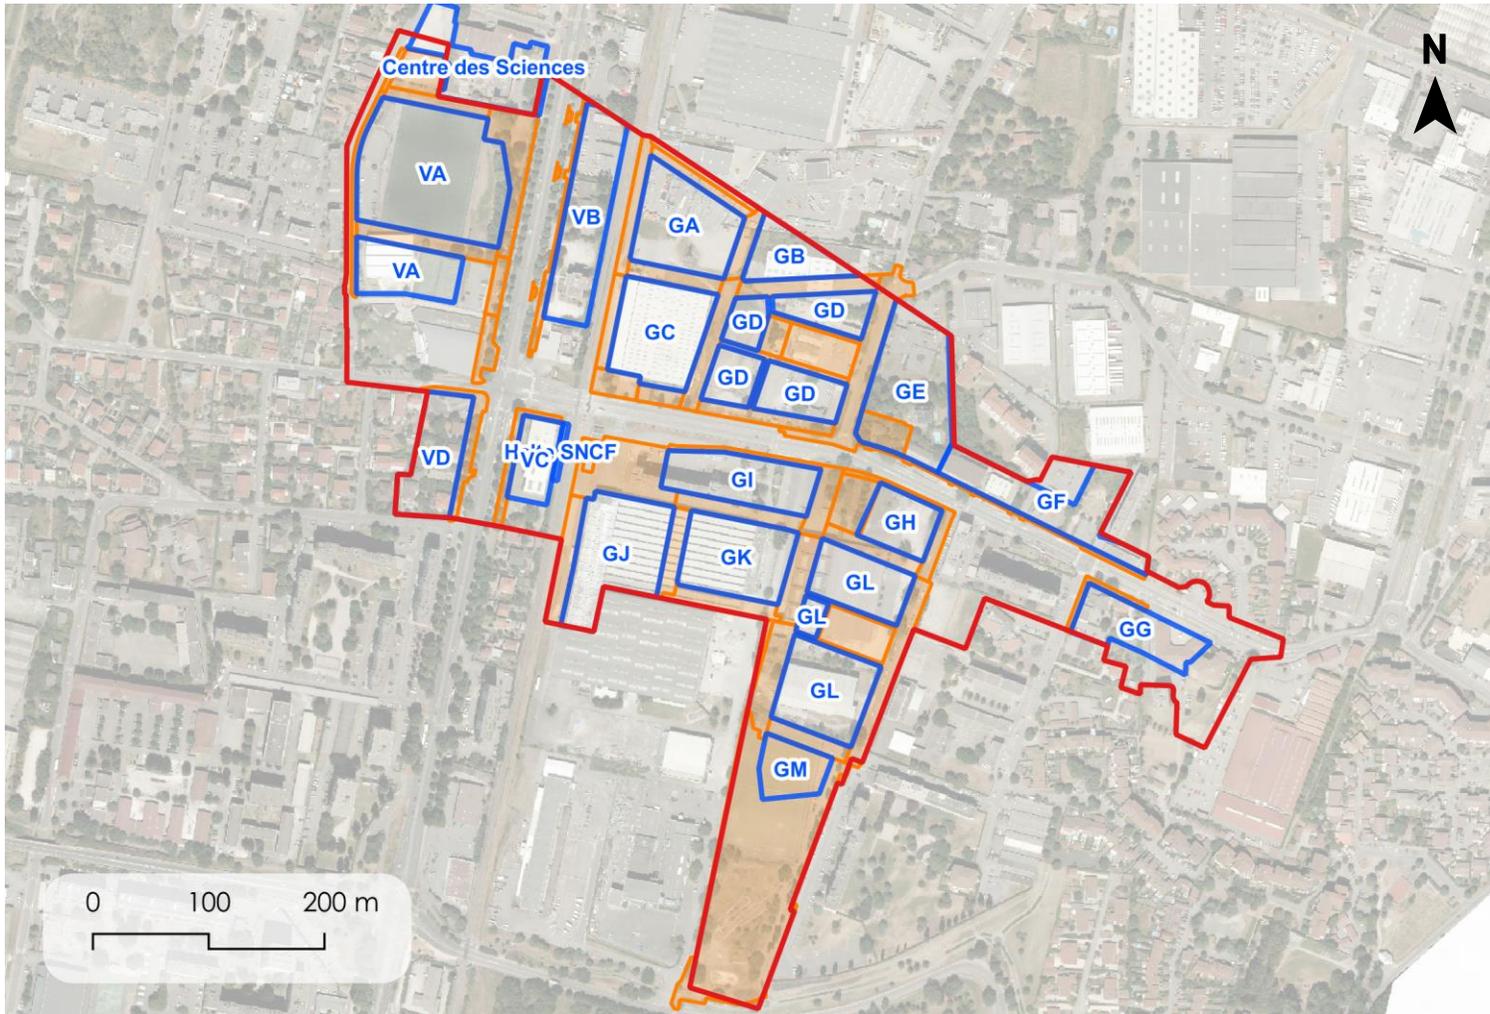

-  Périmètre ZAC
-  Îlot
-  Lot
-  Bâtiment
-  Espace public

PHASAGE GÉNÉRAL

Présentation de la ZAC – Repérage des lots

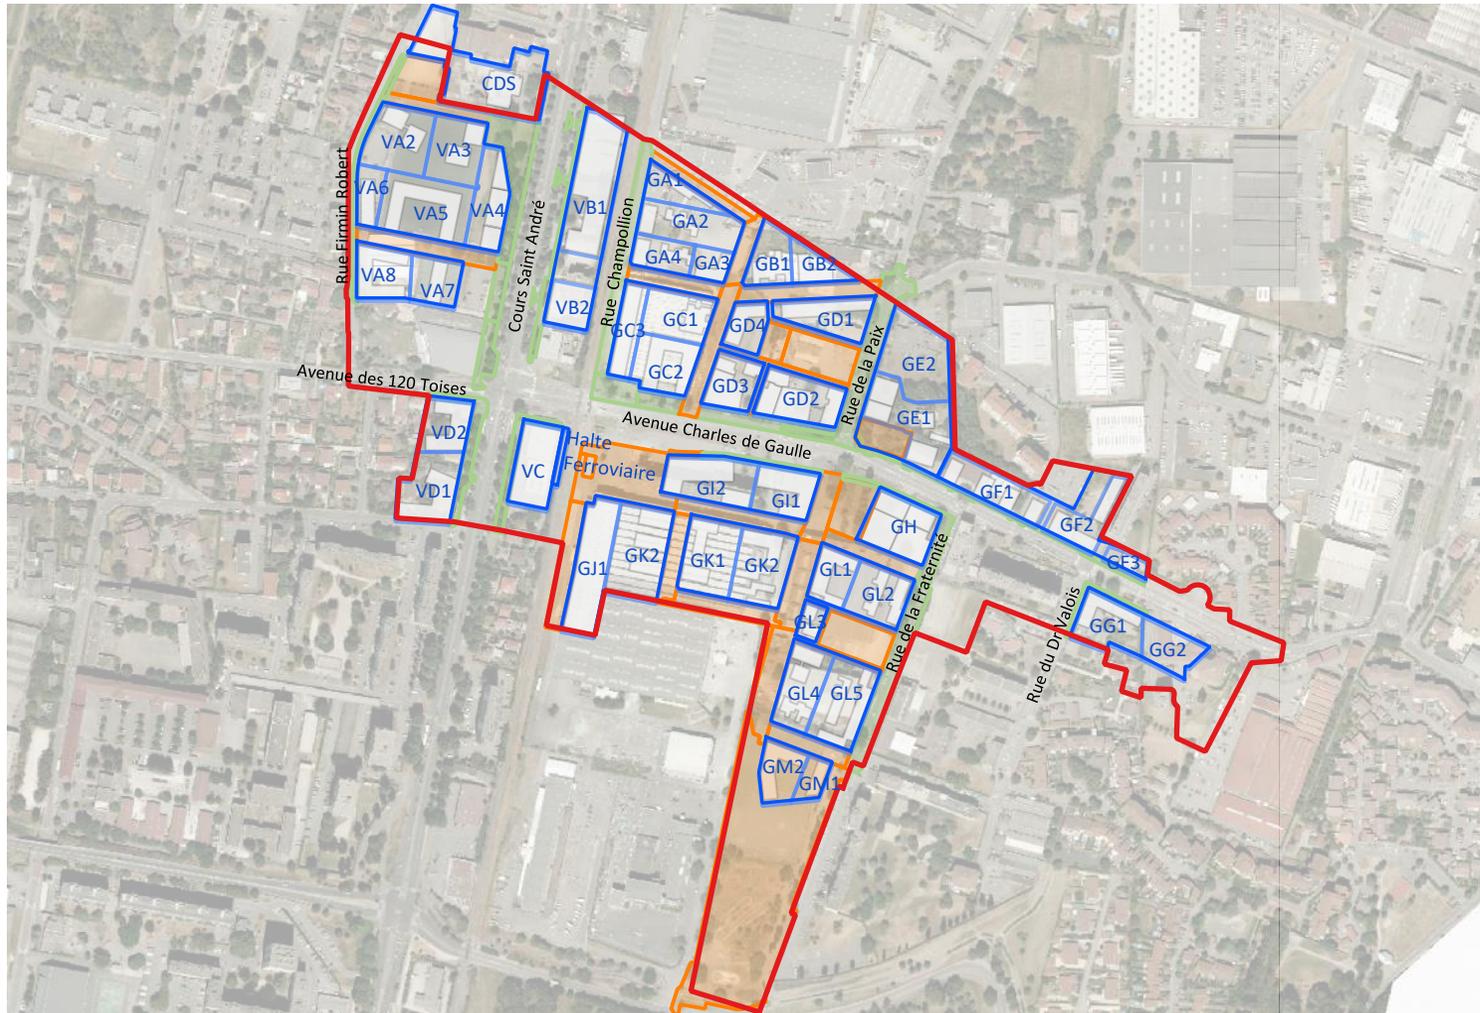

-  Périmètre ZAC
-  Îlot
-  Lot
-  Bâtiment
-  Espace public créé
-  Espace public réaménagé

Présentation des temporalités de la ZAC (prévisionnel)

- « Temps 0 » (projets commercialisés) : 2020 – 2026
 - Opérations sur foncier maîtrisé : ilots GD2/GD3/GE1/GG1/VA4
 - 480 logements / 3 240 m² de commerces et bureaux
- « Temps 1 » (projets à court terme) : 2024 – 2026
 - Opérations sur foncier disponible : Ilots GC / GD4 / GF1
 - 161 logements / 1 650 m² de commerces et bureaux
- « Temps 2 » (projets à moyen terme) : 2026 – 2030
 - Acquisition foncière via expropriation (phase 1)
 - Ilots GI / GL1-2-3 / VB / VC / VD
 - 421 logements / 17 200 m² de commerces, bureaux et équipements sportifs
- « Temps 3 » (projets à long terme) : 2031 – 2037
 - Acquisition foncière via expropriation (phase 2)
 - Ilots GA/GB/GD1/GF2-3/GE2/GG2/GL3-4/VA/GJ/GK/GM
 - 811 logements / 7 000 m² de commerces et bureaux

PHASAGE GÉNÉRAL


Année 2019 – Temps 0



- Livraisons prévues en Décembre 2019 :
 - Chrono Vélo (METRO)
 - Extension Tramway ligne A (SMMAG)
 - PEM Etoile (SMMAG)
 - Parc Simone Lagrange
- ① Démarrage des travaux de GD2 en Décembre 2019

PHASAGE GÉNÉRAL


Année 2020 – Temps 0

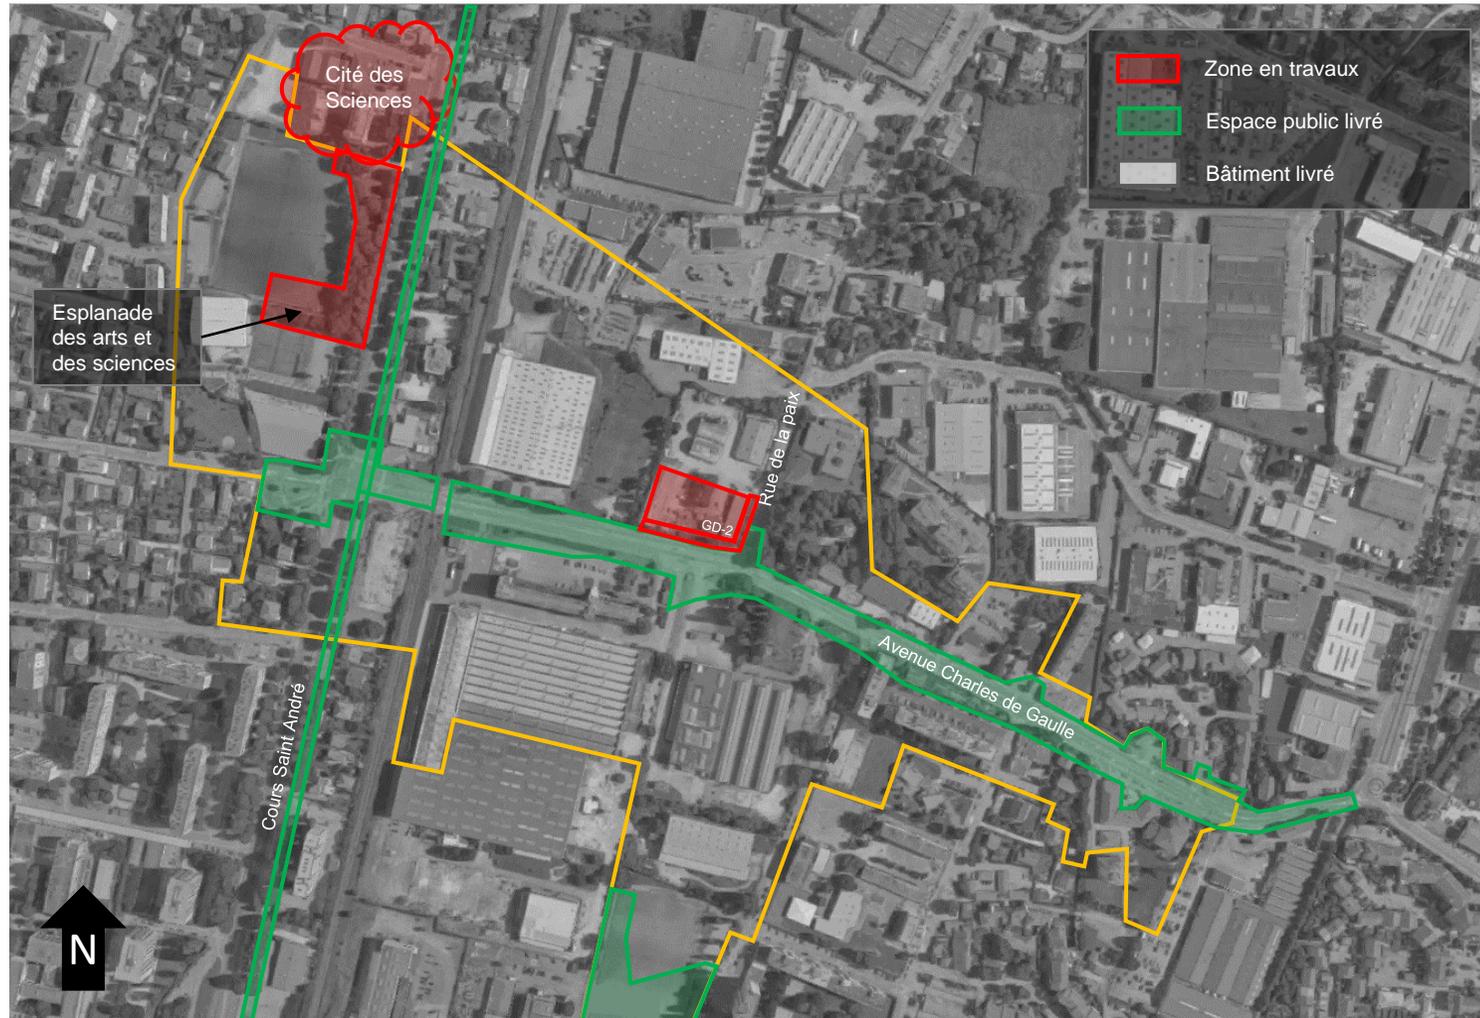

- Démarrage des travaux VA4 prévu T4 2020
- Démarrage des travaux de la Cité des Sciences prévu T2 2020 (METRO)
- Travaux de GD2 en cours

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020					2021					2022					2023					2024					2025																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
■	■	■	■	■																																											

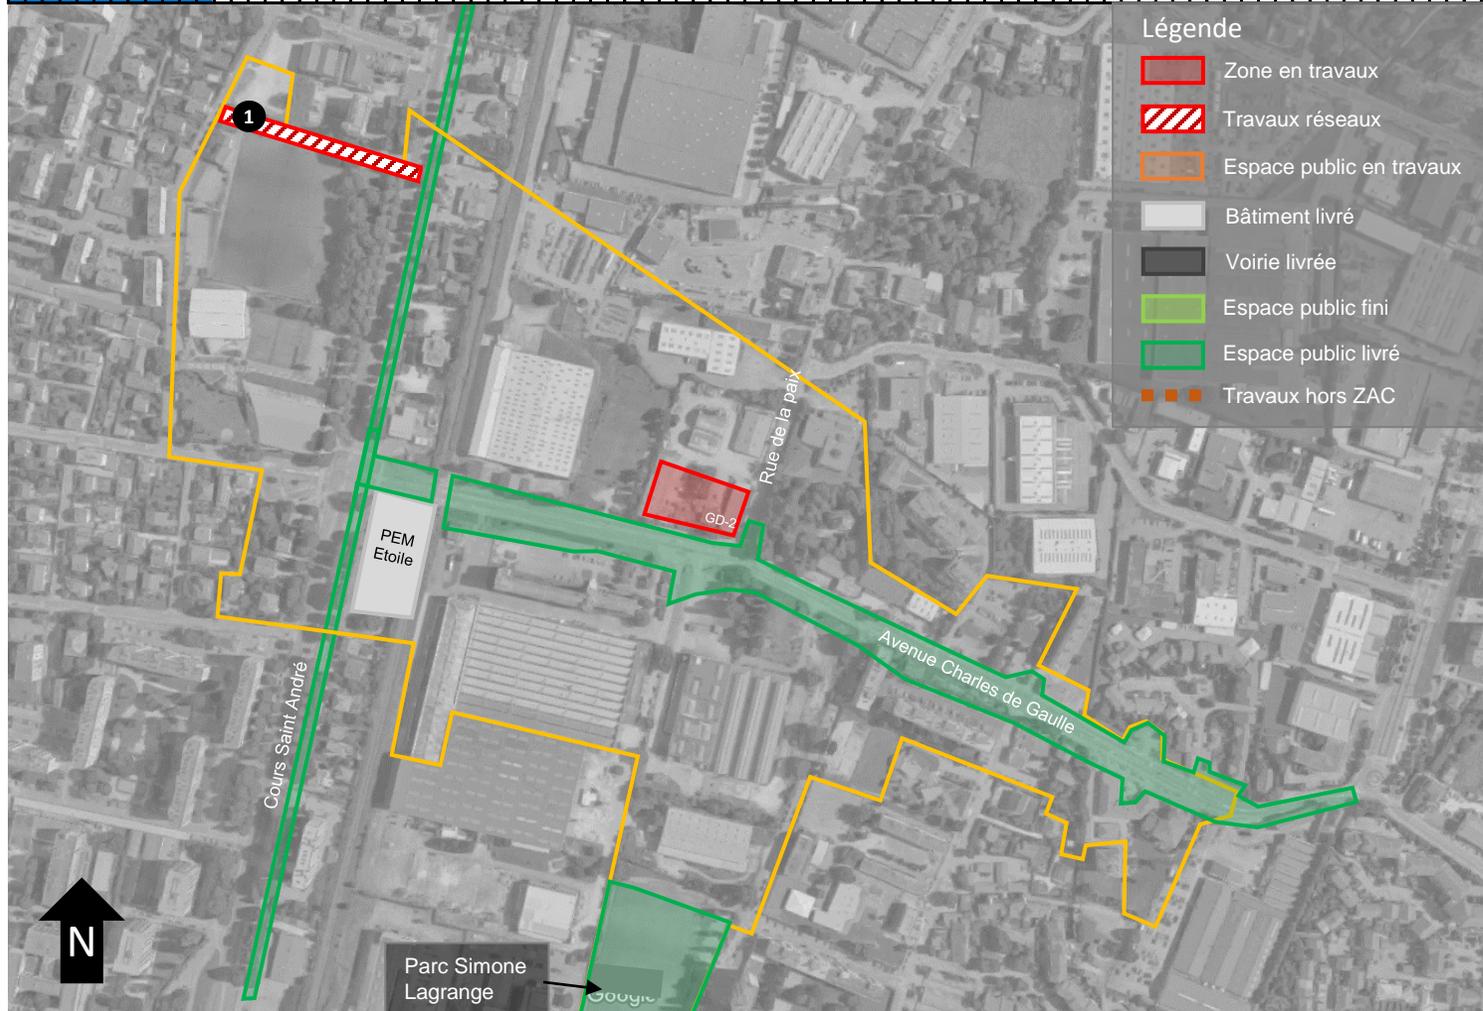

- Légende
- Zone en travaux
 - Travaux réseaux
 - Espace public en travaux
 - Bâtiment livré
 - Voirie livrée
 - Espace public fini
 - Espace public livré
 - Travaux hors ZAC

① Réalisation des réseaux de la venelle au nord de VA4

Un nombre limité d'interface à prévoir mais le chantier de GD2 est en proximité immédiate avec la voie du tram.

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2020				2021				2022				2023				2024				2025																																							
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



- 1 Intervention CCIAG réseau HP Charles de Gaulle Nord : S42 à S46.
Travaux de création du réseau CU hors raccordement.
→ Prévoir un alternat pour la circulation sur rue de la Paix
- 2 Travaux réseaux rue Jean Moulin fin année 2020

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

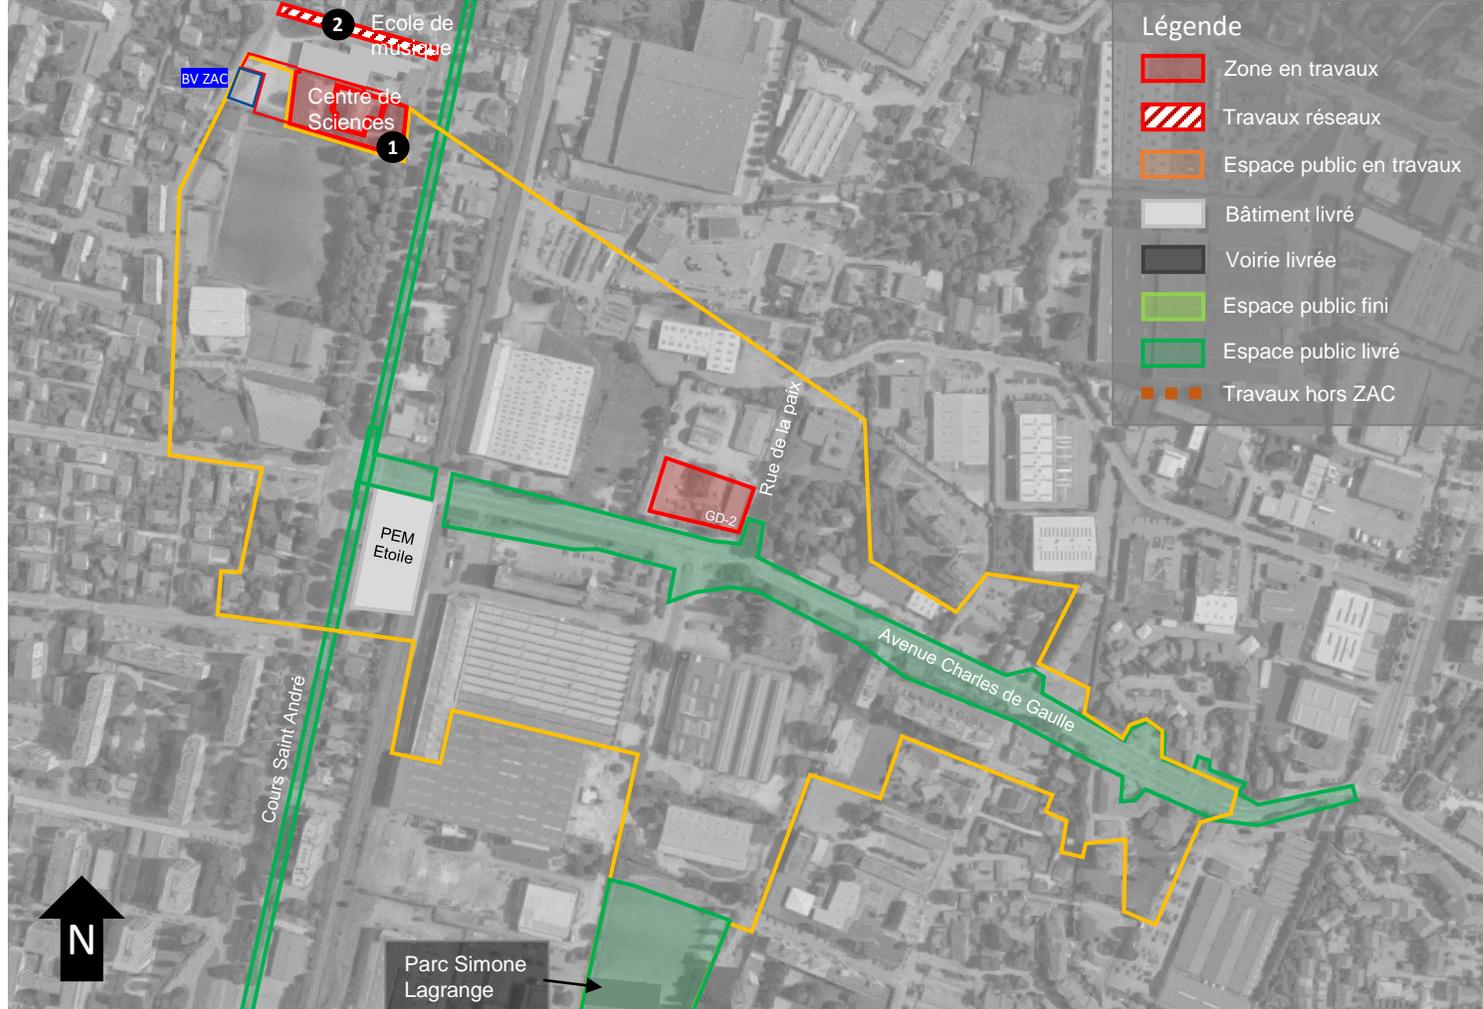

1 Démarrage des travaux du planétarium du Centre de Sciences / Cosmocité

Démarrage des travaux d'aménagements extérieurs du Centre de Sciences Lot VRD en décembre 2020

2 Travaux réseaux eau rue Jean Moulin fin année 2020

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



- ❶ Travaux d'aménagements extérieurs ZAC Phase 1 venelle + esplanade des arts : 29/03/21 – 24/12/21
- ❷ Travaux EP Réseaux ½ chaussée Est rue de la Paix : 29/03/21 – 23/04/21
Travaux de raccordement CCIAG pour GD2.

Dépôt PC ilot GH au printemps 2021

Dépôt PC ilot GE1 en mars 2021

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



- ① Travaux d'aménagement espaces publics groupe scolaire hors ZAC en été 2021
- ② Travaux EP Terrassement – Bordure/Voirie Contre allée 1 : 18/06/21 – 15/07/21
- ③ Travaux de chauffage urbain rue Firmin Robert hors ZAC en juin 2021

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



- 1 Travaux d'aménagement espaces publics groupe scolaire hors ZAC en été 2021
- 2 Travaux EP Terrassement – Bordure/Voirie 1/2 chaussée Est rue de la Paix : 16/07/21 – 26/08/21

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



- ① Travaux EP Terrassement – Bordure/Voie 1/2 chaussée Ouest rue de la Paix : 27/08/21 – 30/09/21
- ② Travaux réseaux sec rue Jean Moulin hors ZAC :
 - Si option 1: septembre 2021 à fin décembre 2021

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

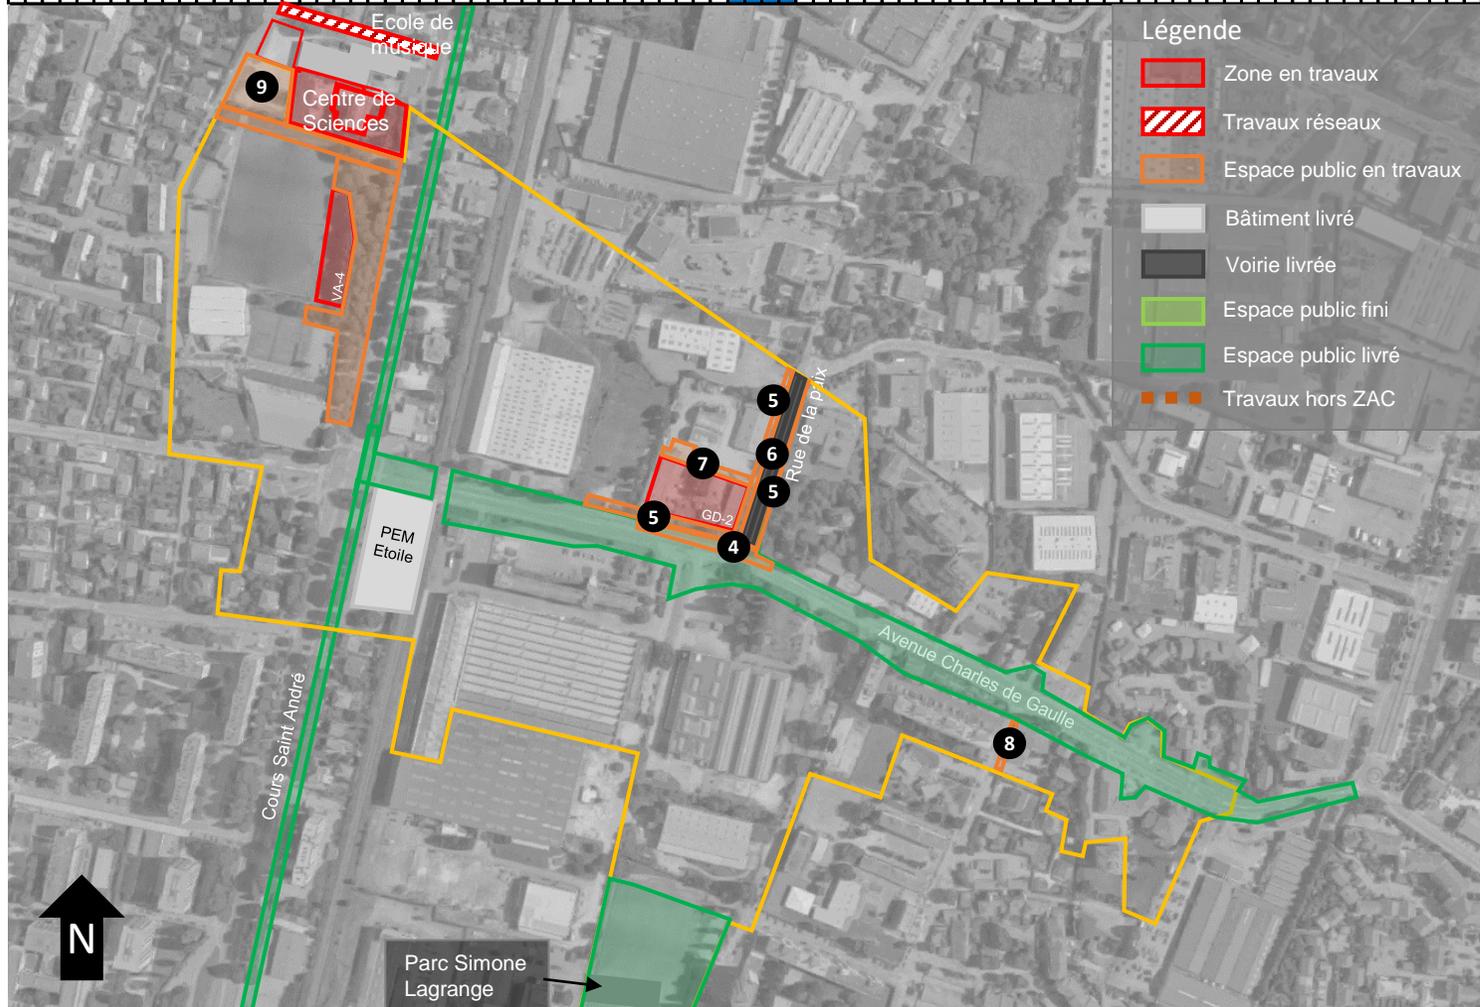


- ④ Travaux EP Terrassement – Bordure/Voirie
Carrefour Paix/De Gaulle : 01/10/21 – 14/10/21
- ⑤ Travaux EP GD SH/SV + mobilier et espaces verts :
15/10/21 – 11/11/21
- ⑥ Travaux de nuit : réalisation des tapis rue de la Paix
- ⑦ Travaux EP Venelle GDA + aire de retournement
véhicule incendie : 15/10/21 – 29/11/21
- ⑧ Travaux EP rue Docteur Valois : 15/11/21 – 06/12/21
- ⑨ Démarrage travaux d'aménagement parking ZAC
stationnement 3 : 15/11/21 – 13/01/22

→ Déplacement base vie du Centre de Sciences

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2020												2021												2022												2023												2024												2025											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

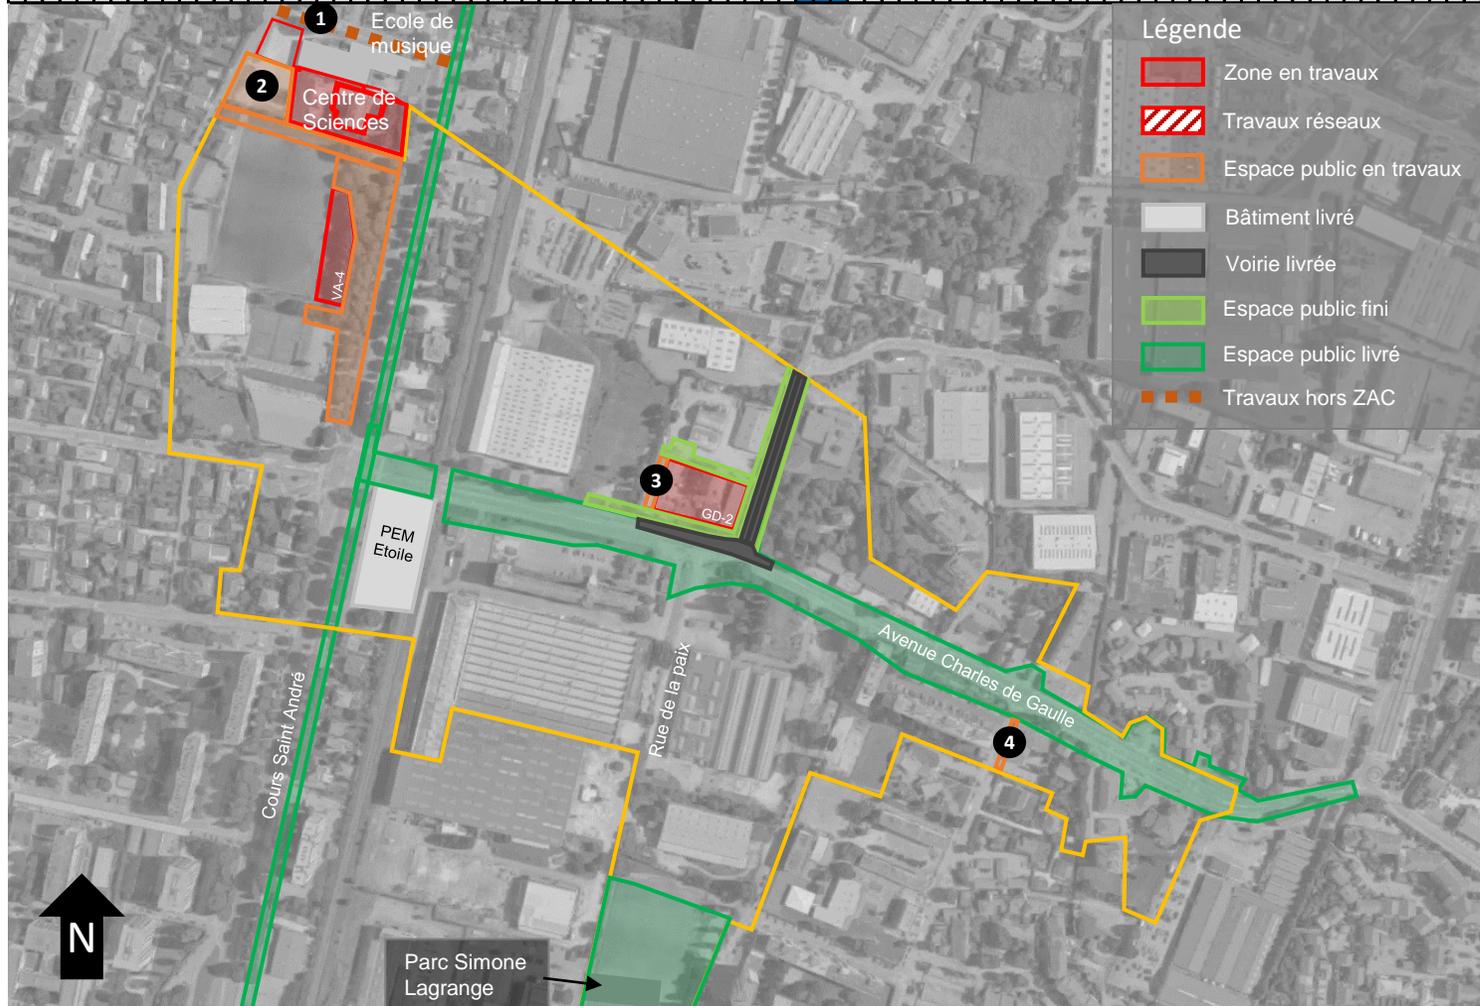


- ① Travaux d'enfouissement de réseaux rue Jean Moulin hors ZAC fin 2021 – début 2022

Travaux réseaux sec rue Jean Moulin hors ZAC :
➤ Si option 2: début janvier 2022 à fin mars 2022
- ② Travaux d'aménagement parking ZAC stationnement 3 : 15/11/21 – 13/01/22
- ③ Travaux EP Venelle GDC : 30/11/21 – 14/12/21
- ④ Travaux EP rue Docteur Valois : 15/11/21 – 06/12/21

Espaces publics GD2 livrés sauf venelle GDC

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

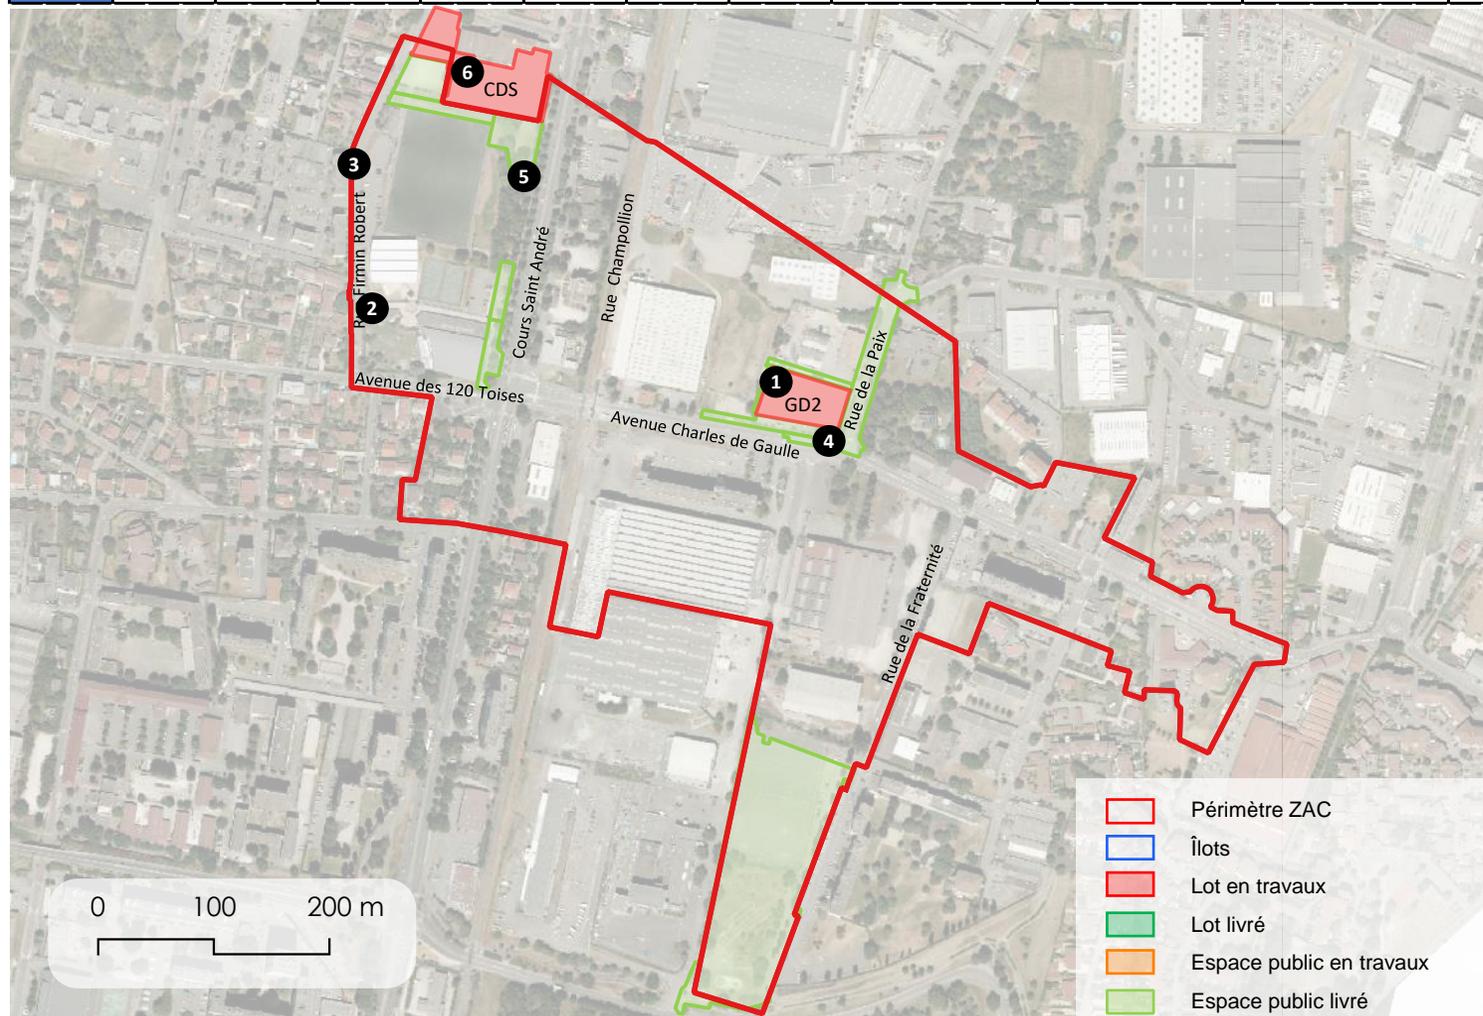

- ① Livraison des bâtiments B et C du lot GD2 en mars 2022
- ② Travaux CCIAG réseau BP sur Firmin Robert
- ③ Travaux ENEDIS HTA/ BT sur Firmin Robert
- ④ Livraison de la Rue de la Paix 1, de la contre allée Ch. de Gaulle **sauf emprise chantier GD3** et des venelles R. Brentse et R. Wolczak en février 2022
- ⑤ Livraison de la Venelle VA, du parking et de l'esplanade T. Pesquet **excepté au droit du lot VA4** en février 2022
- ⑥ Centre de Sciences : chantier en cours

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

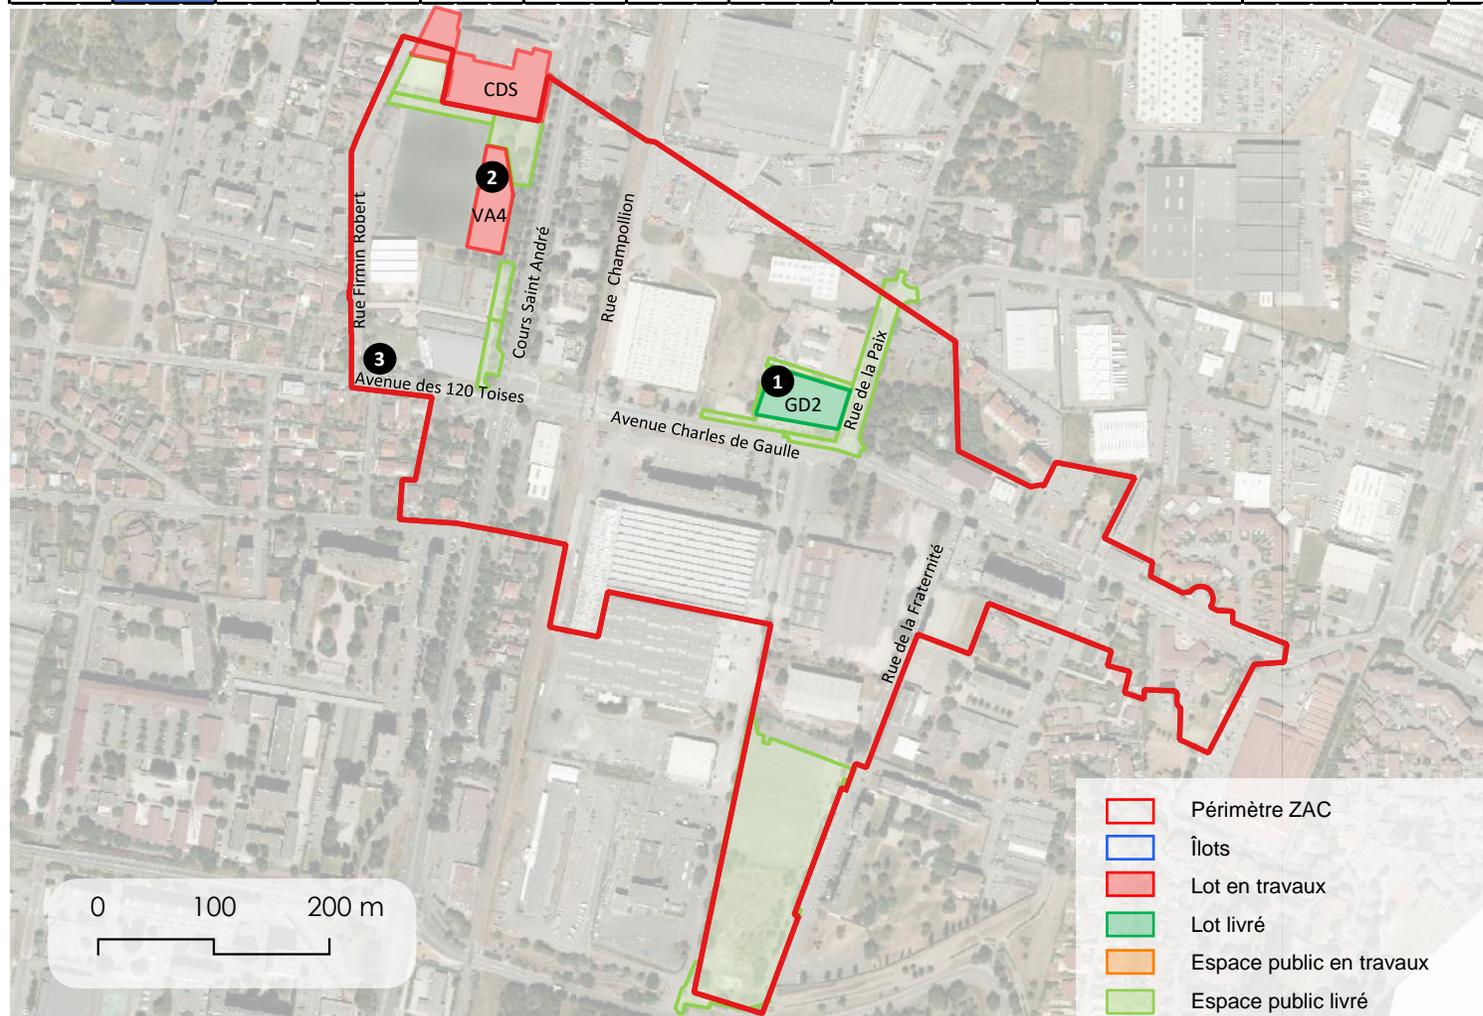


- ① Livraison des bâtiments A et D du lot GD2 en mai et juin 2022
- ② Démarrage des travaux lot VA4 en juin 2022
- ③ Travaux CCIAG réseau BP Tronçon Flottibulle et abaissement de réseaux sur Firmin Robert

0 100 200 m

- Périmètre ZAC
- Îlots
- Lot en travaux
- Lot livré
- Espace public en travaux
- Espace public livré

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

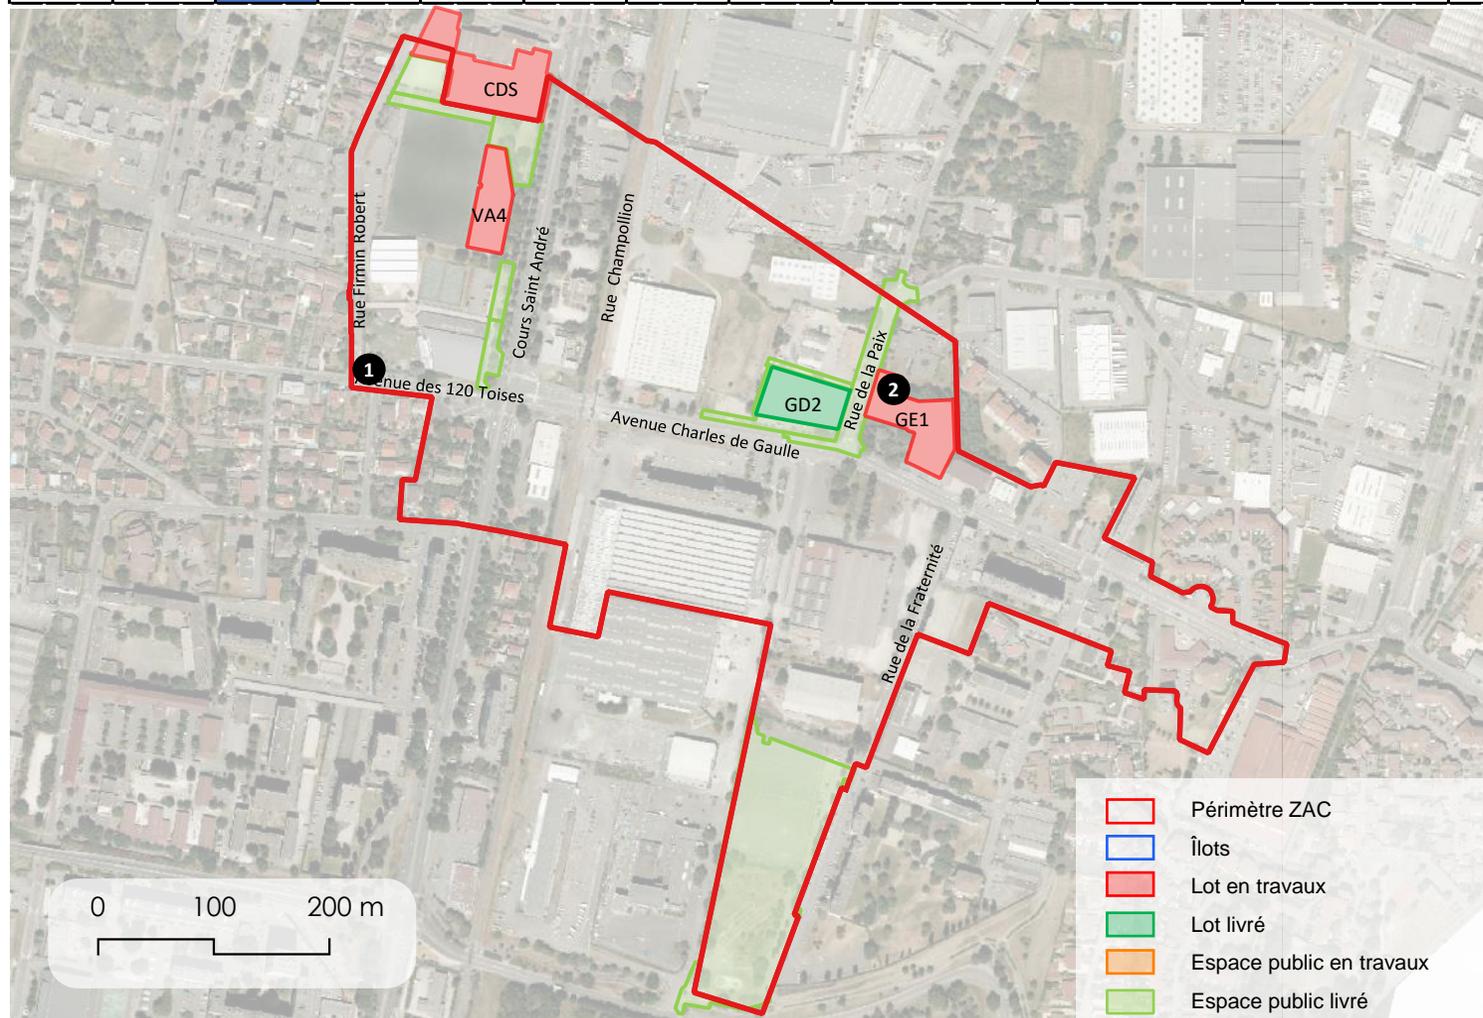


- 1 Travaux CCIAG réseau HP rue des 120 Toises et sous station Flottibulle d'août à septembre 2022
- 2 Démarrage travaux lot GE1 en octobre 2022

0 100 200 m

- Périmètre ZAC
- Îlots
- Lot en travaux
- Lot livré
- Espace public en travaux
- Espace public livré

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

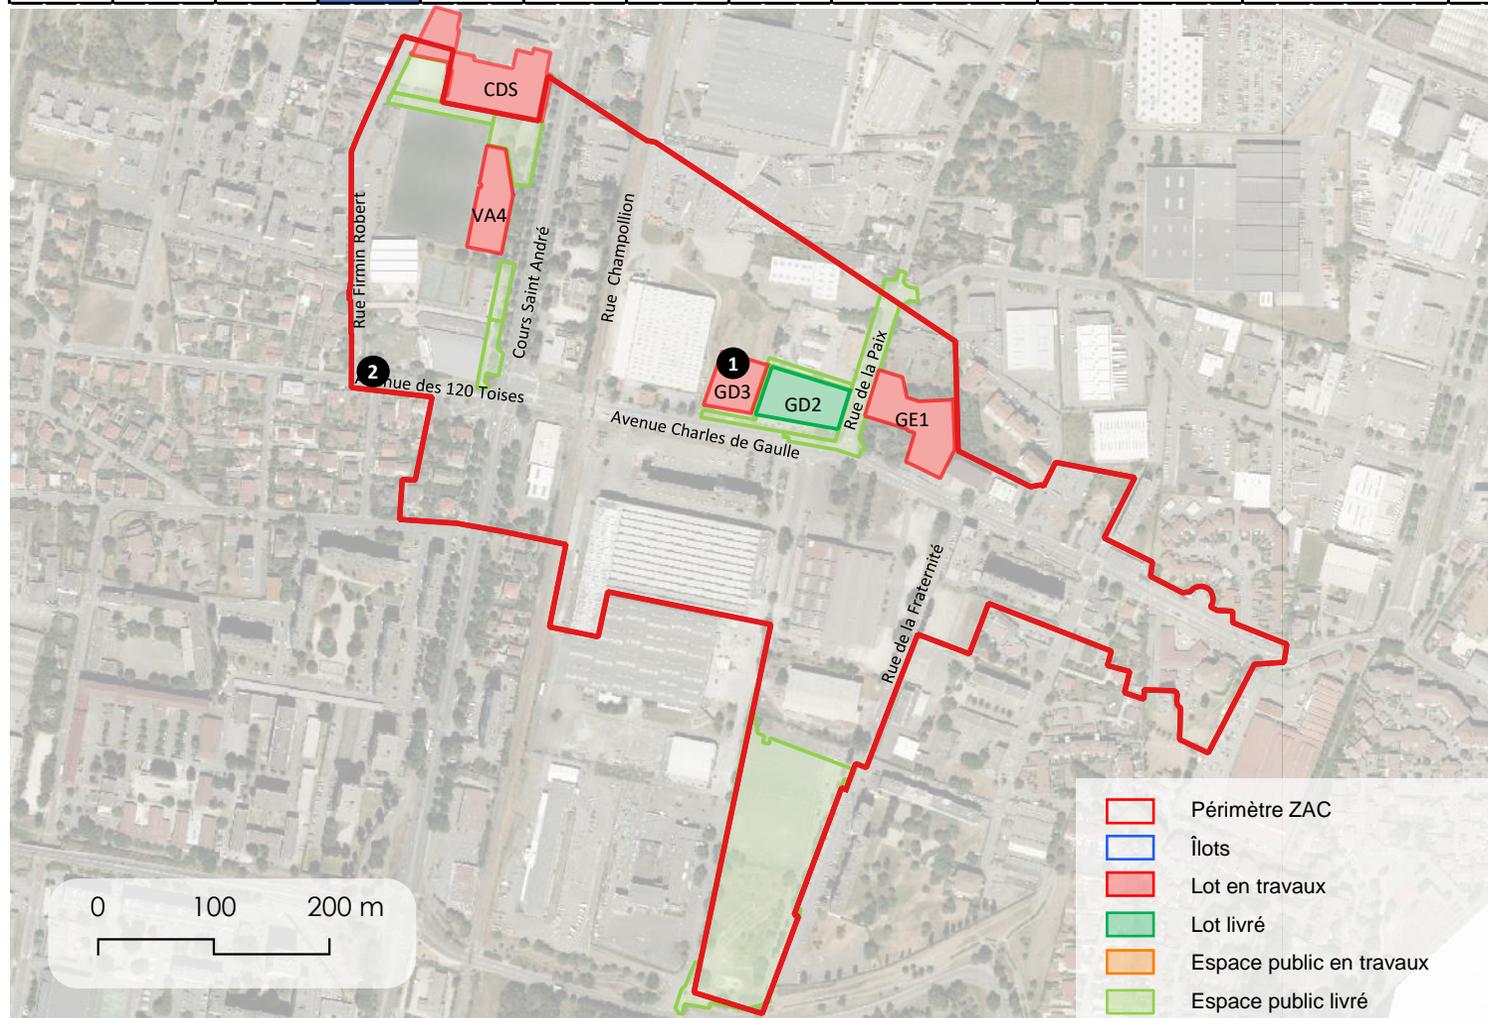

- ❶ Démarrage des travaux de pré-terrassement du lot GD3 en octobre 2022
- ❷ Livraison de la sous station Flottibulle en novembre 2022

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0

2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

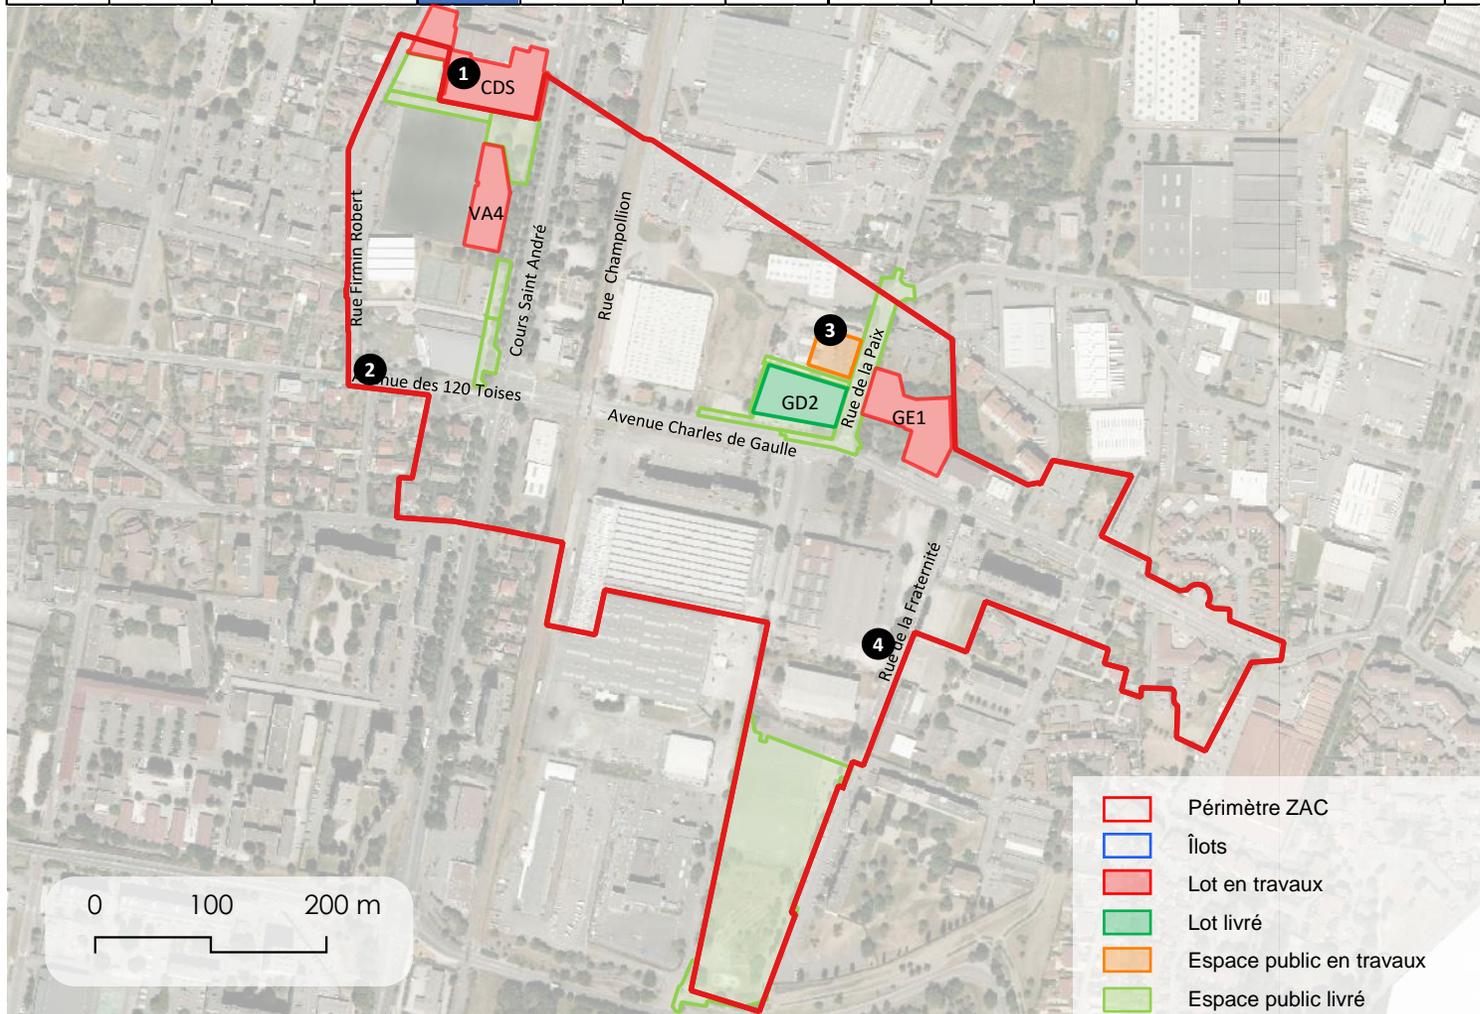


- ❶ Livraison du centre des Sciences en mars 2023
- ❷ Livraison de la sous station CU Flottibulle en février 2023
- ❸ Aménagement parking provisoire GD de janvier à mars 2023
- ❹ Travaux sous-station fraternité de mars à juillet 2023

- Périmètre ZAC
- Îlots
- Lot en travaux
- Lot livré
- Espace public en travaux
- Espace public livré

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022					2023					2024					2025					2026					2027																										
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				

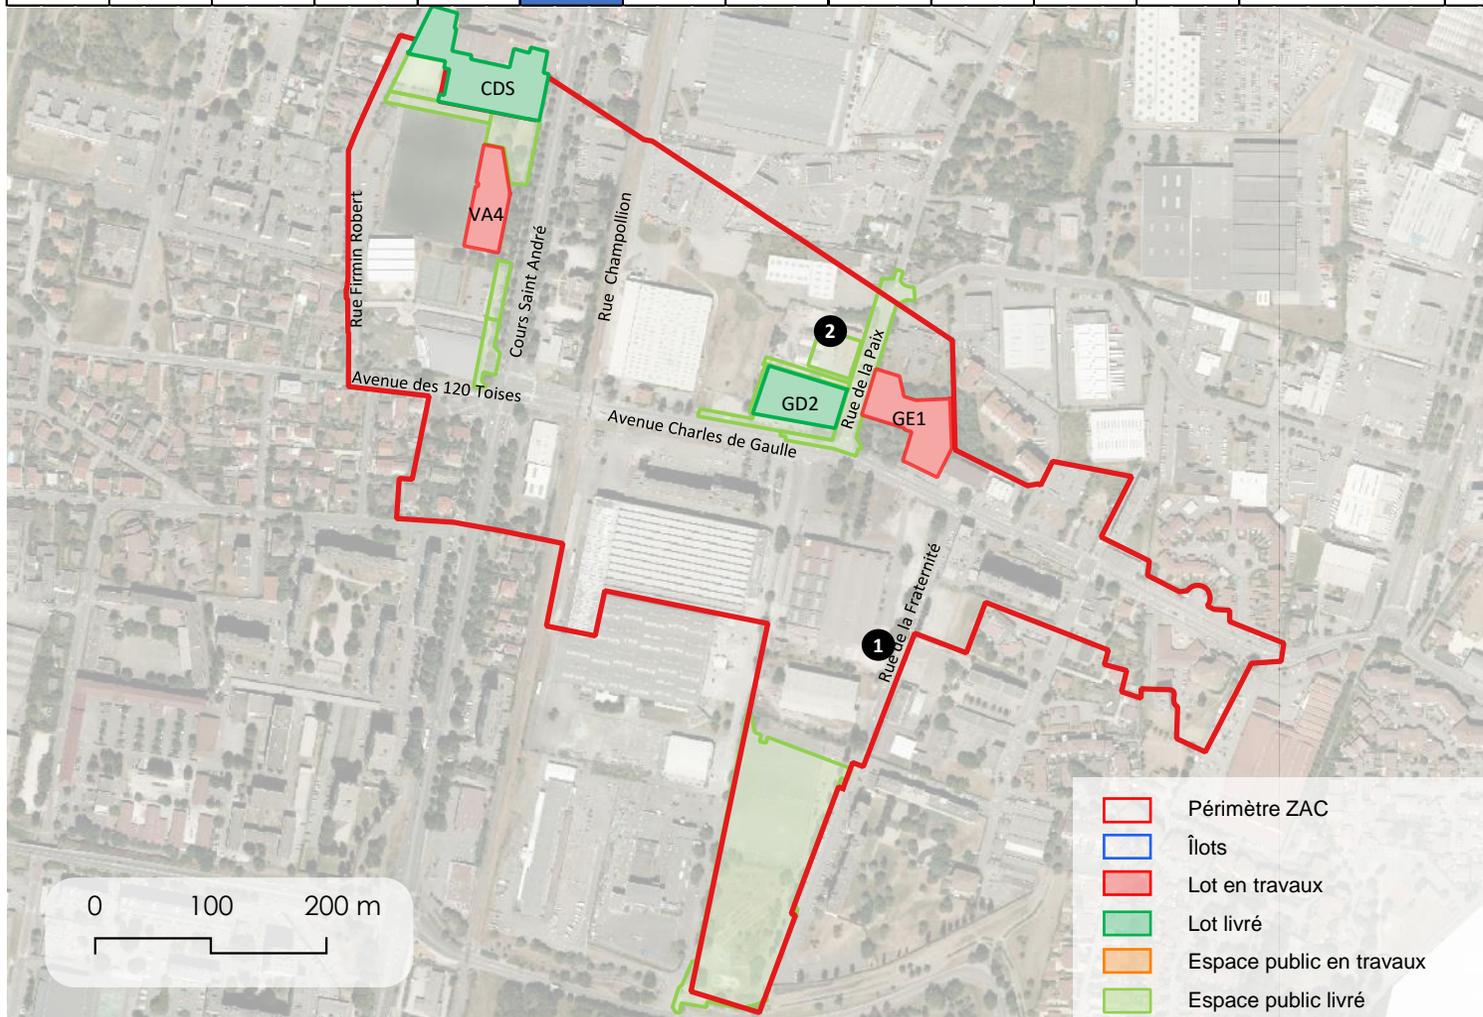

- 1 Travaux sous-station fraternité de mars à juillet 2023
- 2 Livraison parking provisoire GD fin mars 2023

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

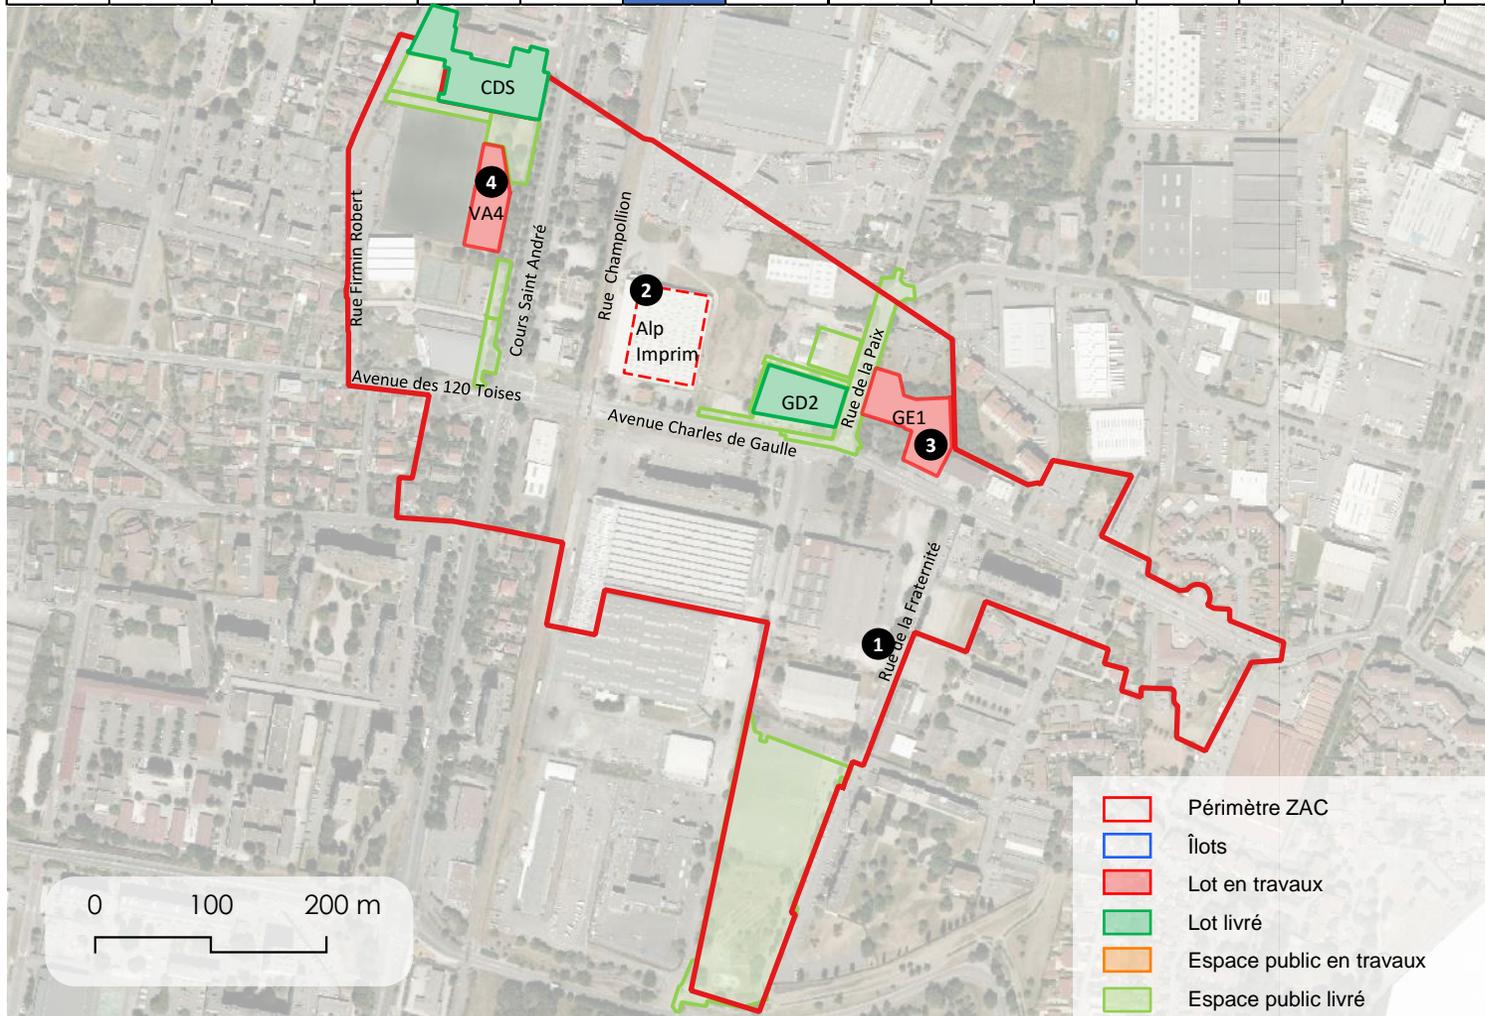

- ❶ Travaux sous-station fraternité de mars à fin 2023 (fin du GO en juillet 2023 et mise en service en septembre 2023)
- ❷ Fin des travaux de démolition de Alp 'Imprim en juillet 2023
- ❸ Travaux GE1 en cours
- ❹ Travaux VA4 en cours

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022				2023				2024				2025				2026				2027																																							
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

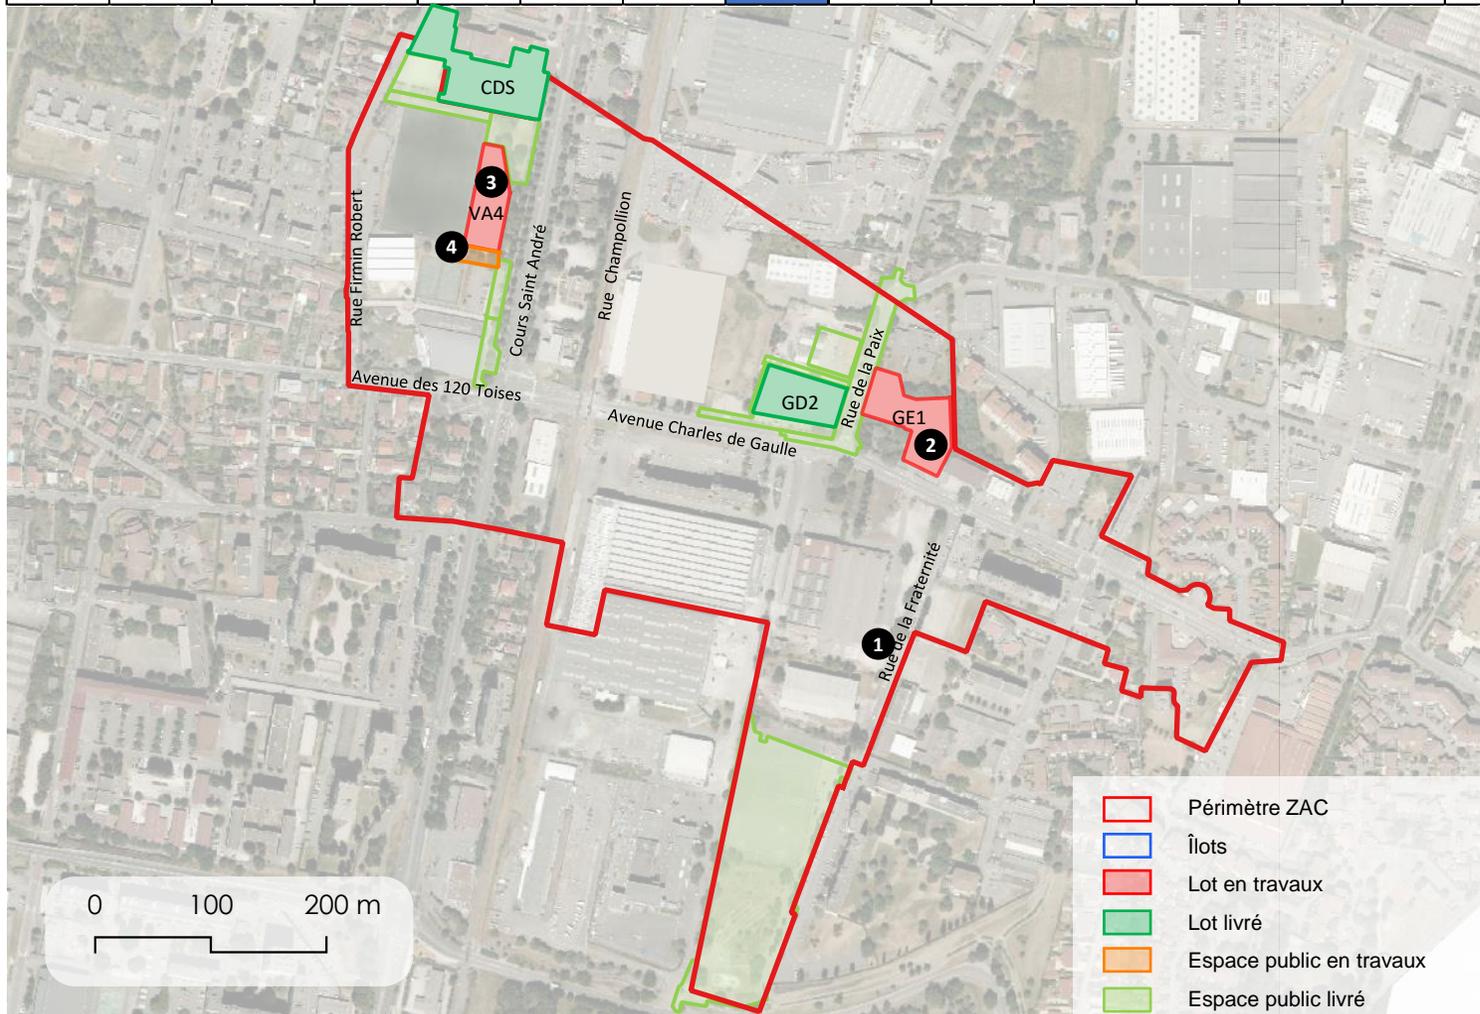

- ❶ Travaux sous-station fraternité de mars à fin 2023 (fin du GO en juillet 2023 et mise en service en septembre 2023)
- ❷ Travaux GE1 en cours
- ❸ Travaux VA4 en cours
- ❹ Travaux d'une partie des abords de VA4 – à partir de mi-novembre 2023

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

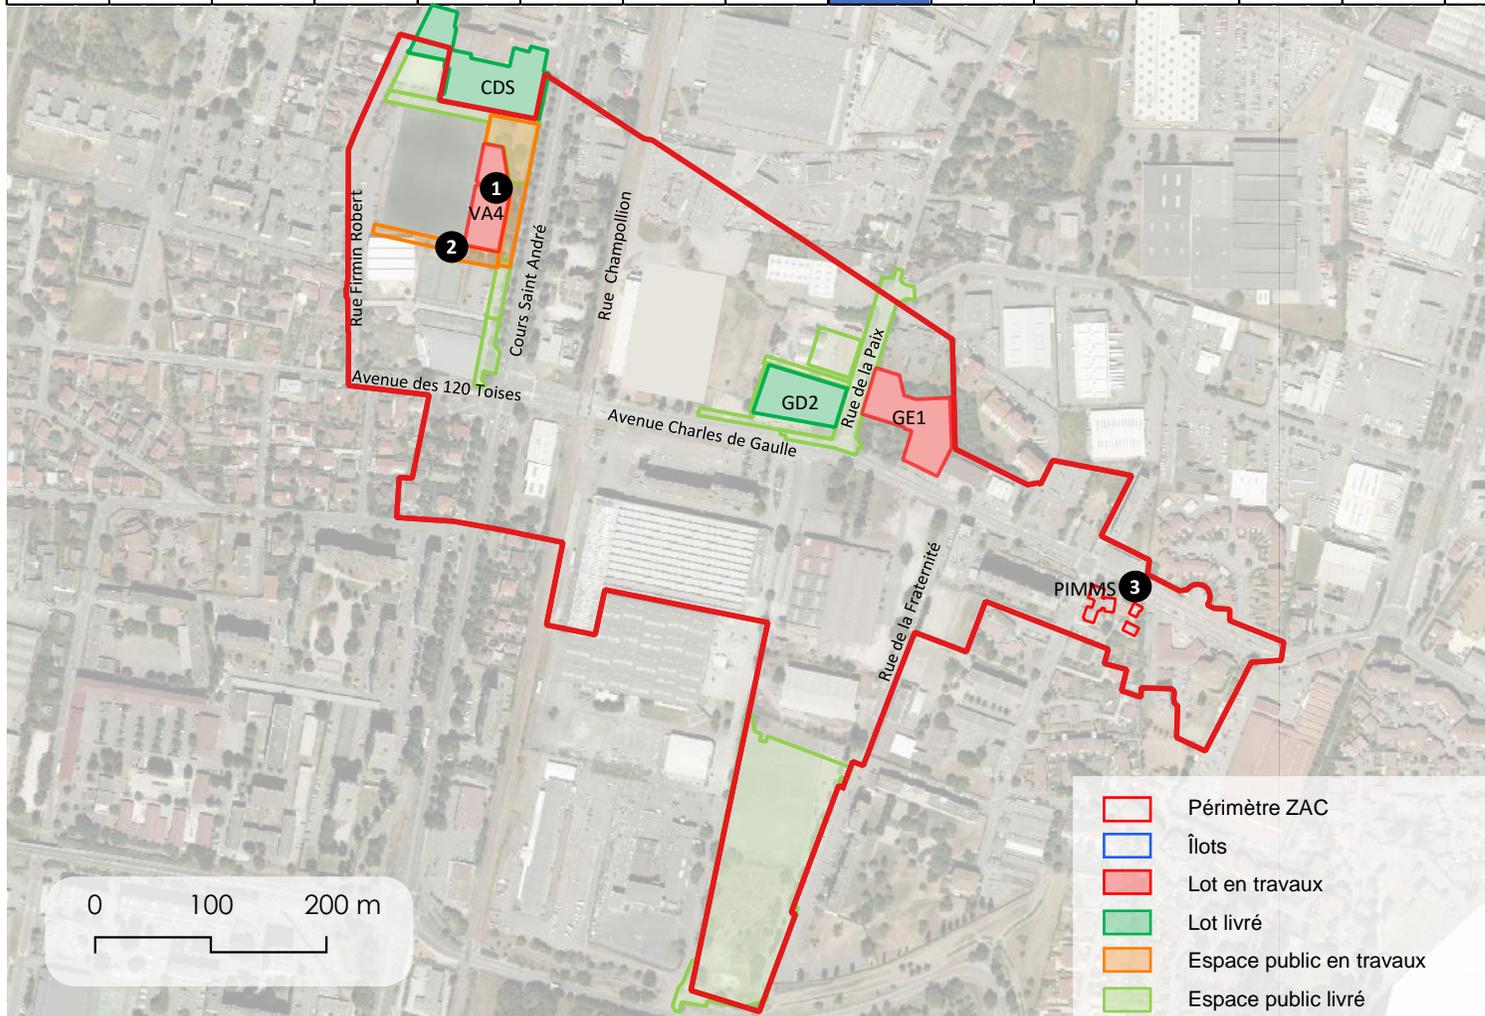

- ❶ Livraison progressive du lot VA4 de janvier à avril 2024
- ❷ Travaux de finitions de l'esplanade Thomas Pesquet et d'aménagement de la rue Louis Barbillon de mars à mai 2024
- ❸ Travaux de désamiantage puis démolition du PIMMS de mars à juin 2024

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

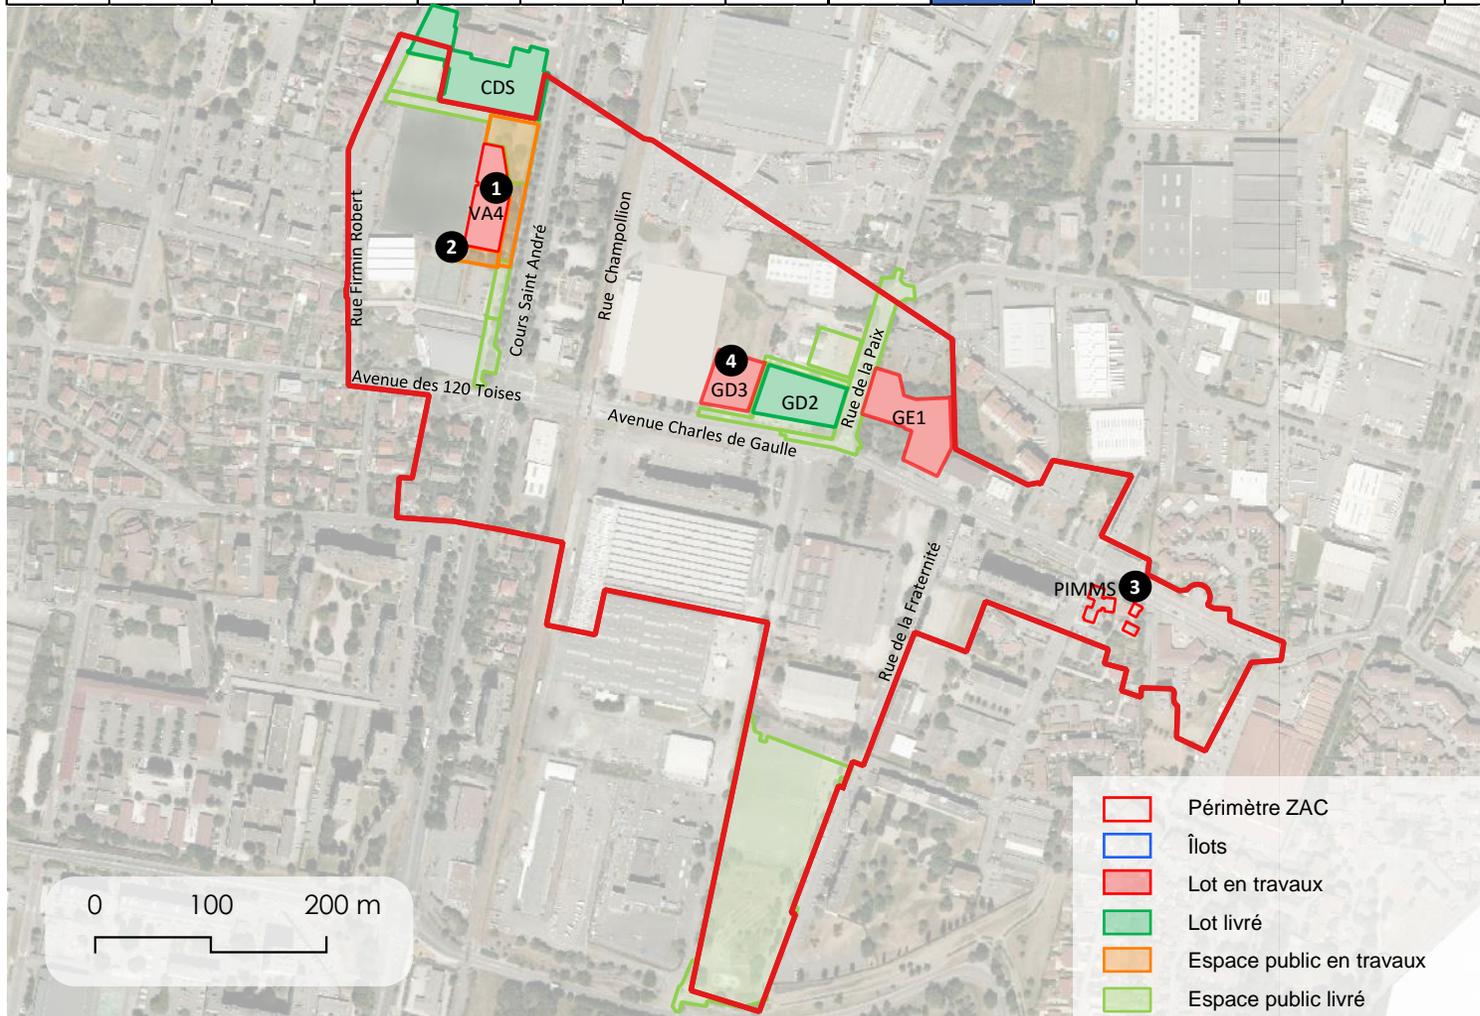

- ❶ Livraison bâtiment A du lot VA4 en avril 2024
- ❷ Travaux de finitions de l'esplanade Thomas Pesquet et d'aménagement d'une portion de la rue Louis Barbillon de mars à mai 2024
- ❸ Travaux de démolition du PIMMS de mars à juin 2024
- ❹ Démarrage du lot GD3 en avril 2024 (à confirmer)

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 0


2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

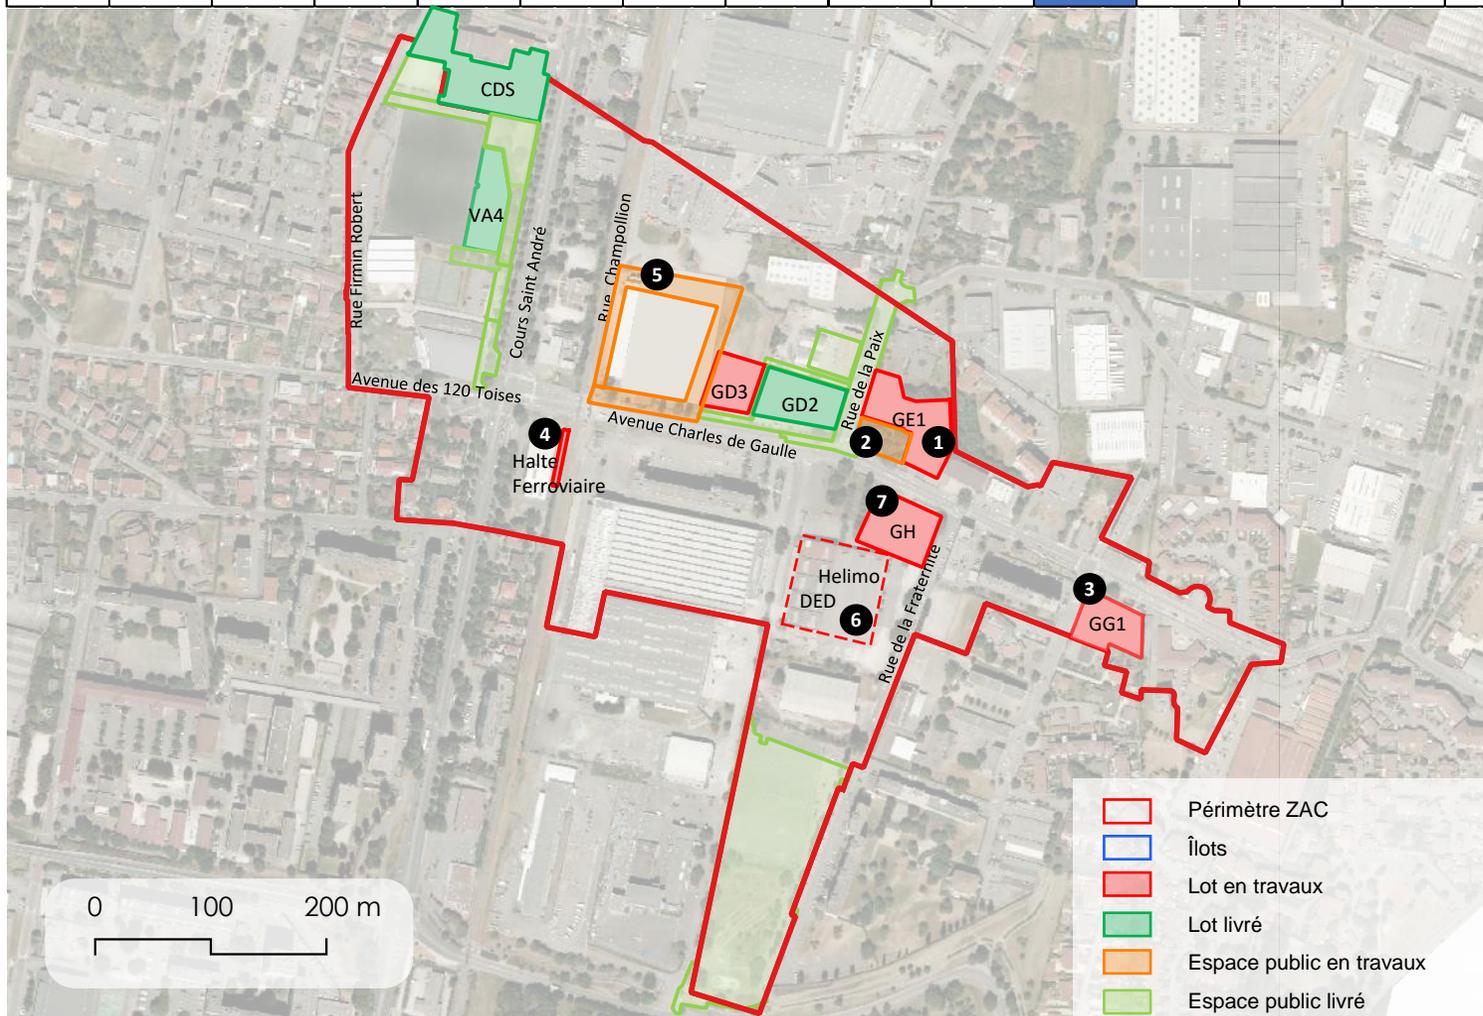

- ① Livraison du bâtiment A et B du lot GE1 en juin 2024
- ② Travaux d'aménagement de la périphérie du lot GE1 et du Jardin Wangari Maathai rue de la Paix 1 est de septembre à décembre 2024
- ③ Démarrage des travaux du lot GG1 en juillet 2024
- ④ Démarrage des travaux de la Halte ferroviaire en juillet 2024
- ⑤ Travaux de viabilisation autour du futur îlot GC de septembre à décembre 2024
- ⑥ Travaux de désamiantage et démolition des bâtiments Helimo et DED de septembre à décembre 2024
- ⑦ Démarrage travaux lot GH en juillet 2024 (à confirmer)

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 1


2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

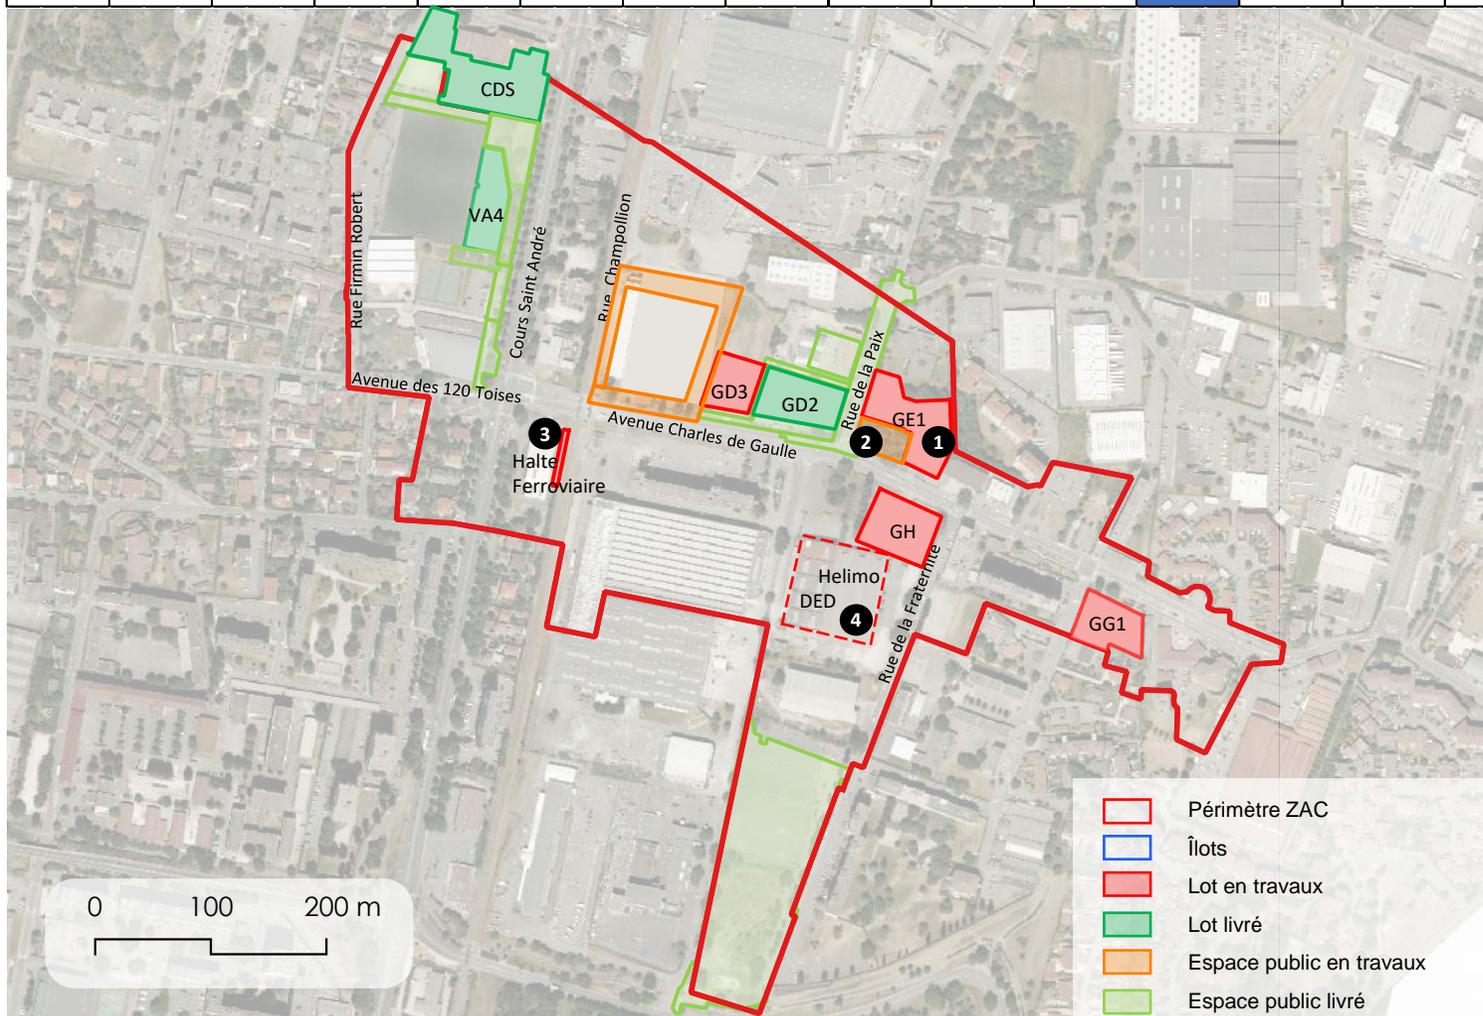

- ❶ Livraison du bâtiments C et D du lot GE1 au T4 2024
- ❷ Travaux d'aménagement de la périphérie du lot GE1 et du Jardin Wangari Maathai rue de la Paix 1 est de septembre à décembre 2024
- ❸ Livraison Halte ferroviaire fin T4 2024
- ❹ Fin des travaux de démolition Helimo et DED en décembre 2024

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 1


2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

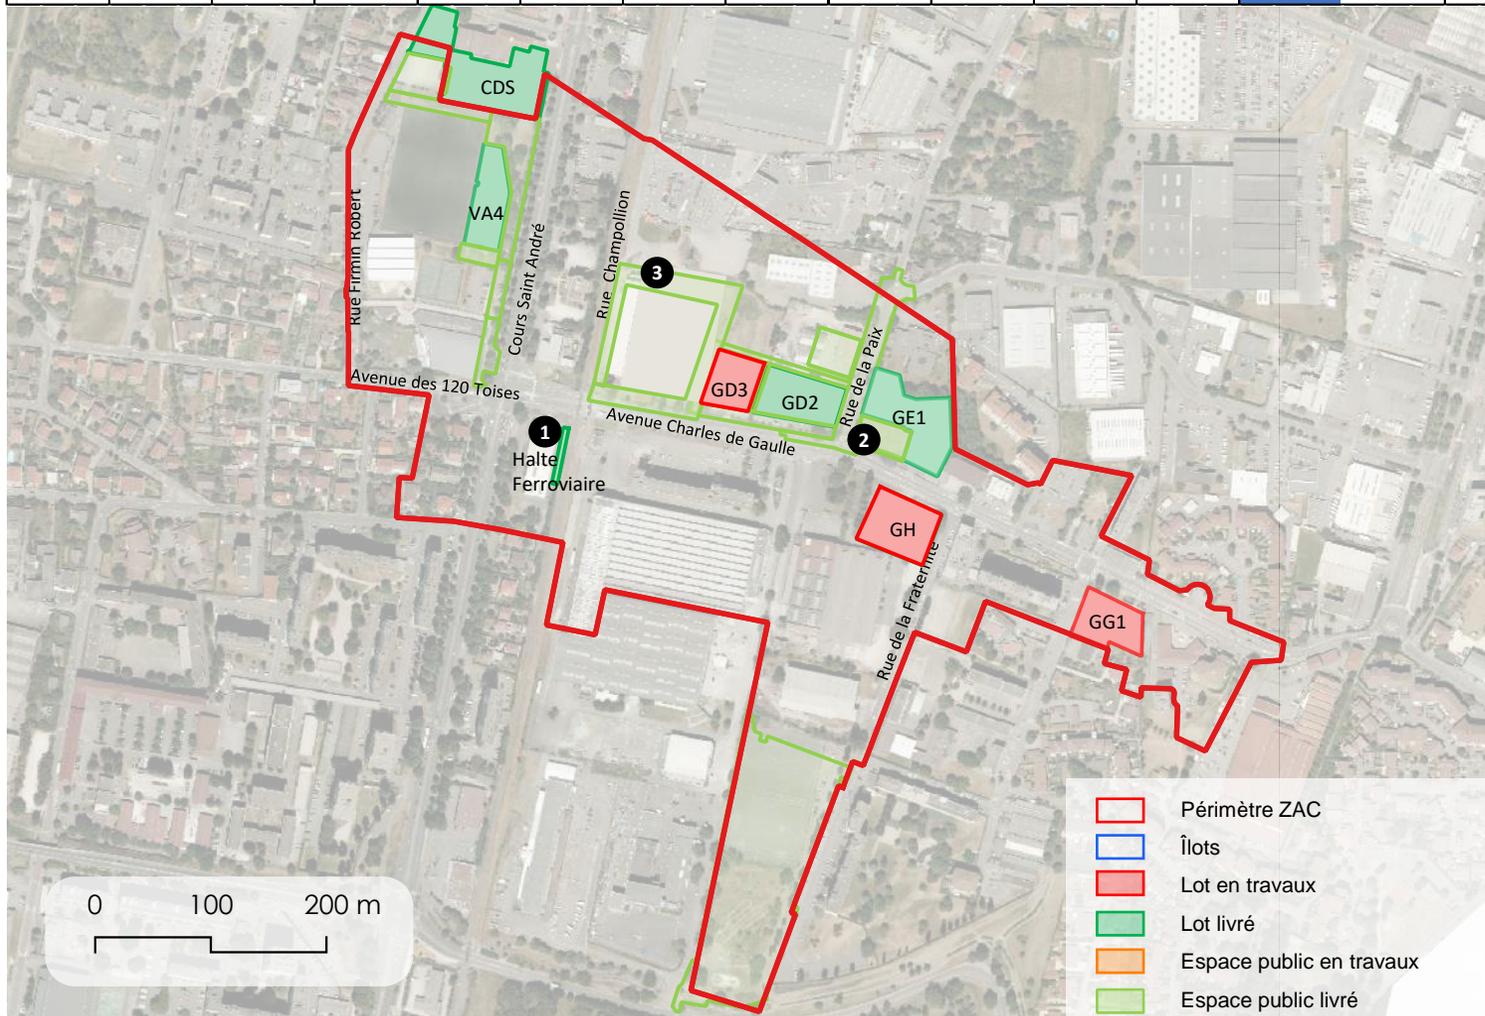

- ❶ Livraison halte ferroviaire fin 2024
- ❷ Livraison des aménagements de la périphérie du lot GE1 – Jardin Wangari Maathai
- ❸ Livraison travaux de viabilisation autour de l'îlot GC

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 1


2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

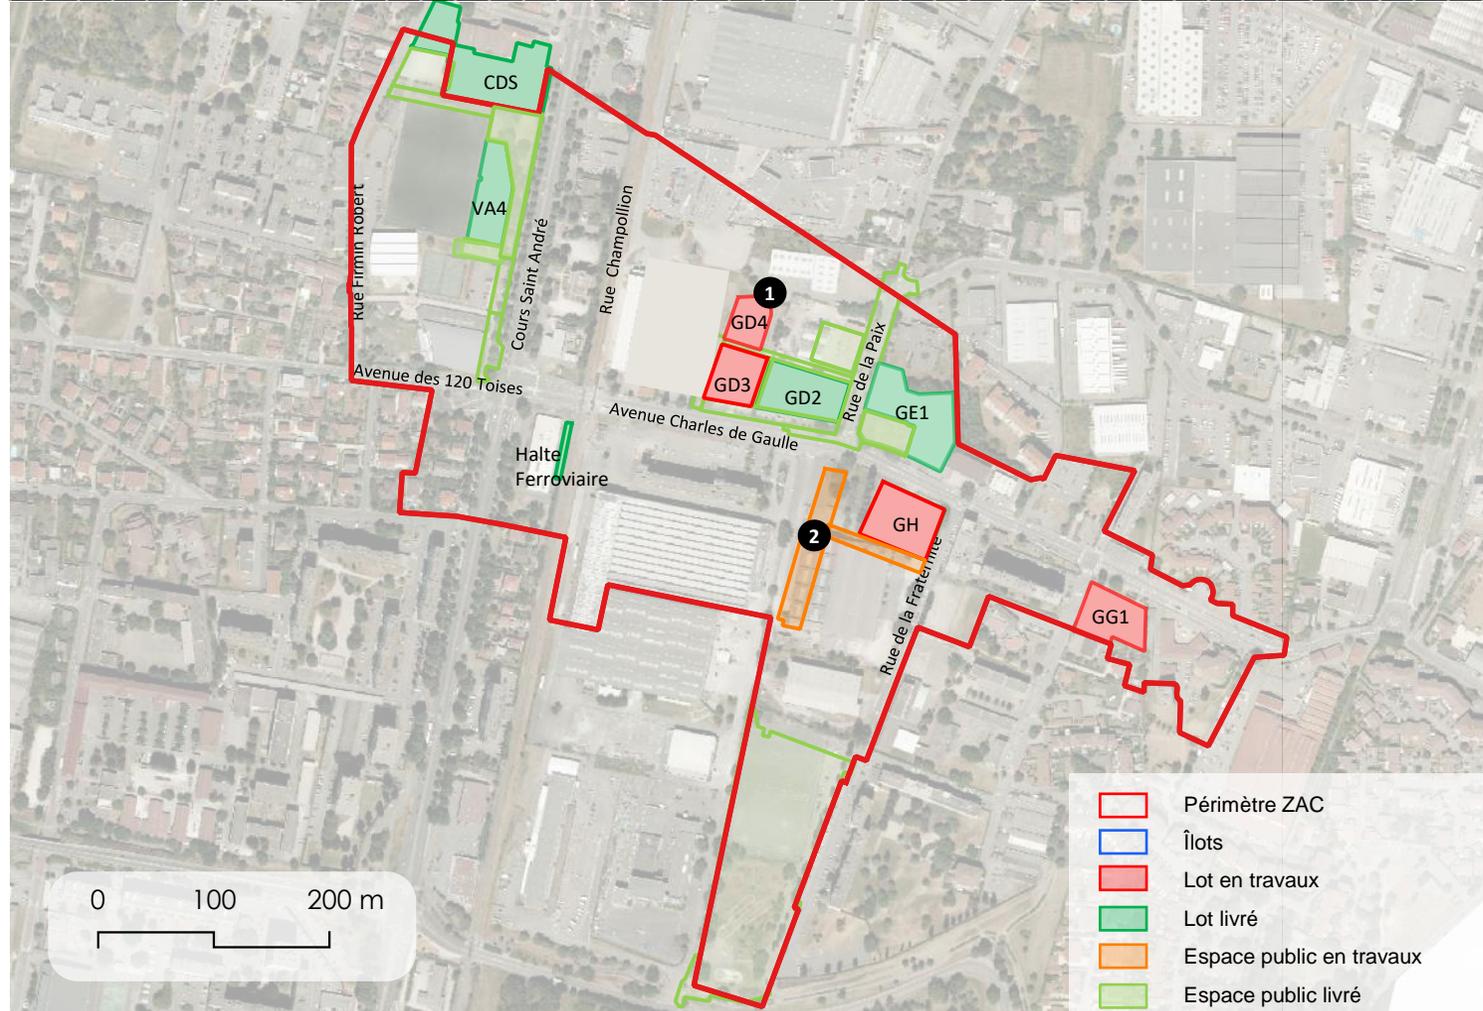

- 1 Démarrage des travaux du lot GD4 au T2 2025
- 2 Travaux viabilisation GI et GL (portion Paix 2 et 3, Gonnet 6 et stationnement 2) du T2 au T3 2025

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 1


2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

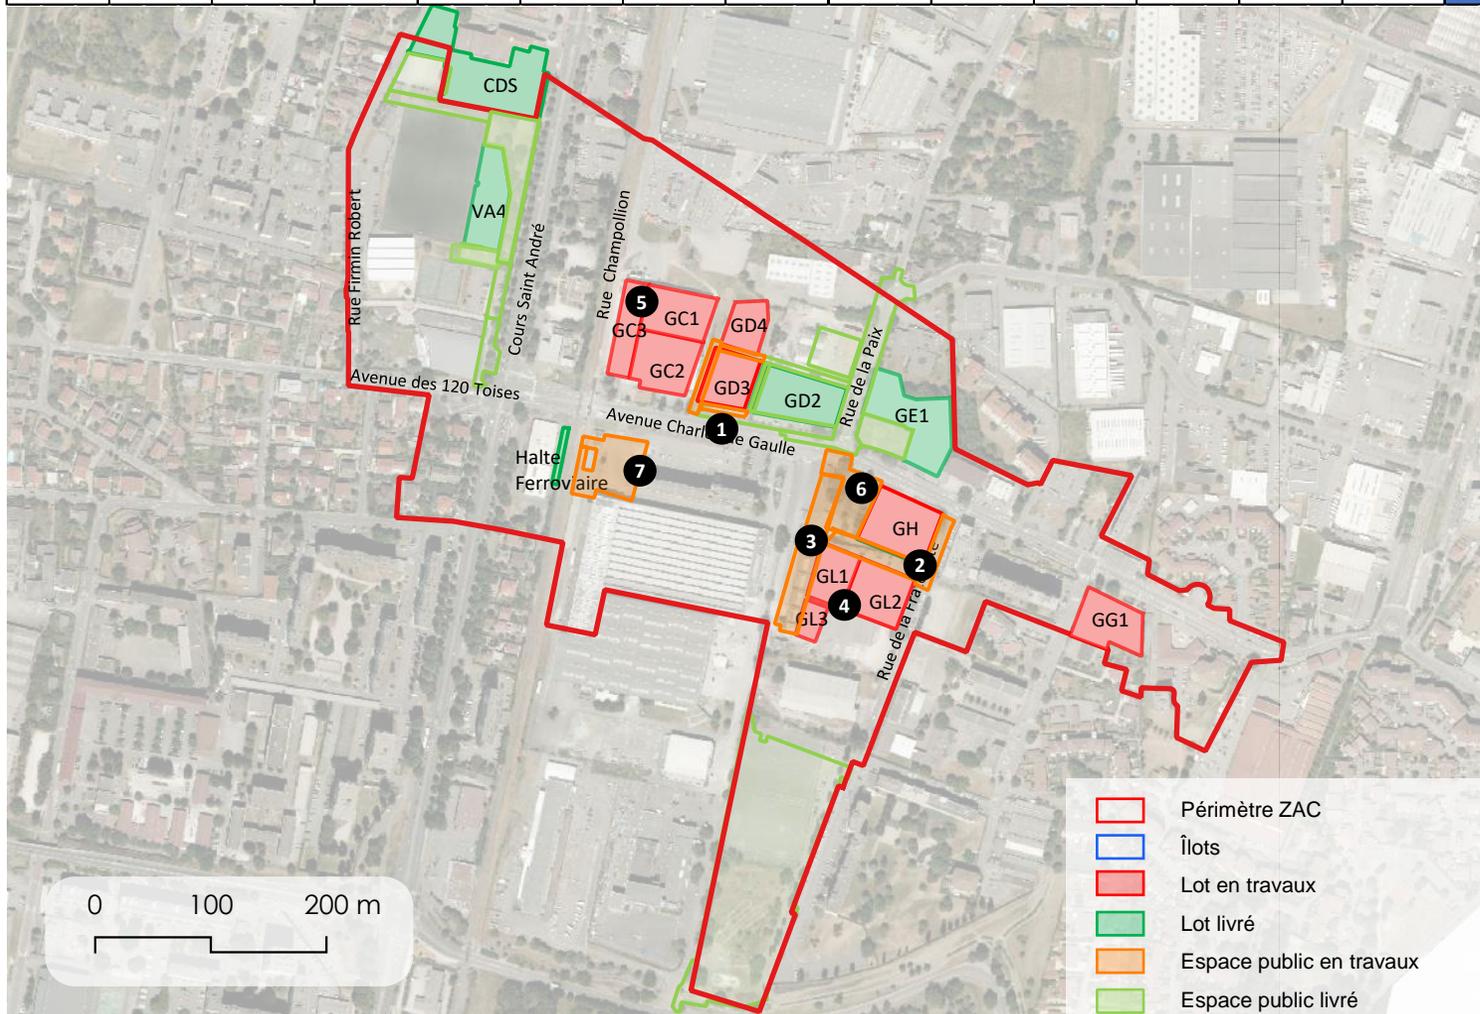

- 1 Travaux d'aménagement de la périphérie du lot GD3 : 1^{ère} portion de la rue Stanislas Dwojakowski, et complément de la contre-allée et de la Venelle Rosette Wolczak au S2 2025
- 2 Travaux d'aménagement de la périphérie du lot GH et de la 1^{ère} portion de la rue Marguerite Gonnet au S2 2025
- 3 Travaux viabilisation GI et GL (portion Paix 2 et 3, Gonnet 6 et stationnement 2) du T2 au T3 2025
- 4 Démarrage des lots GL1, GL2 et GL3 au T4 2025
- 5 Démarrage des lots GC1, GC2 et GC3 au T3 2025
- 6 Aménagement square Bolland et carrefour Charles de Gaulle au S2 2025
- 7 Aménagement partie ouest place Mitterrand au T3 et T4 2025

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 1


2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

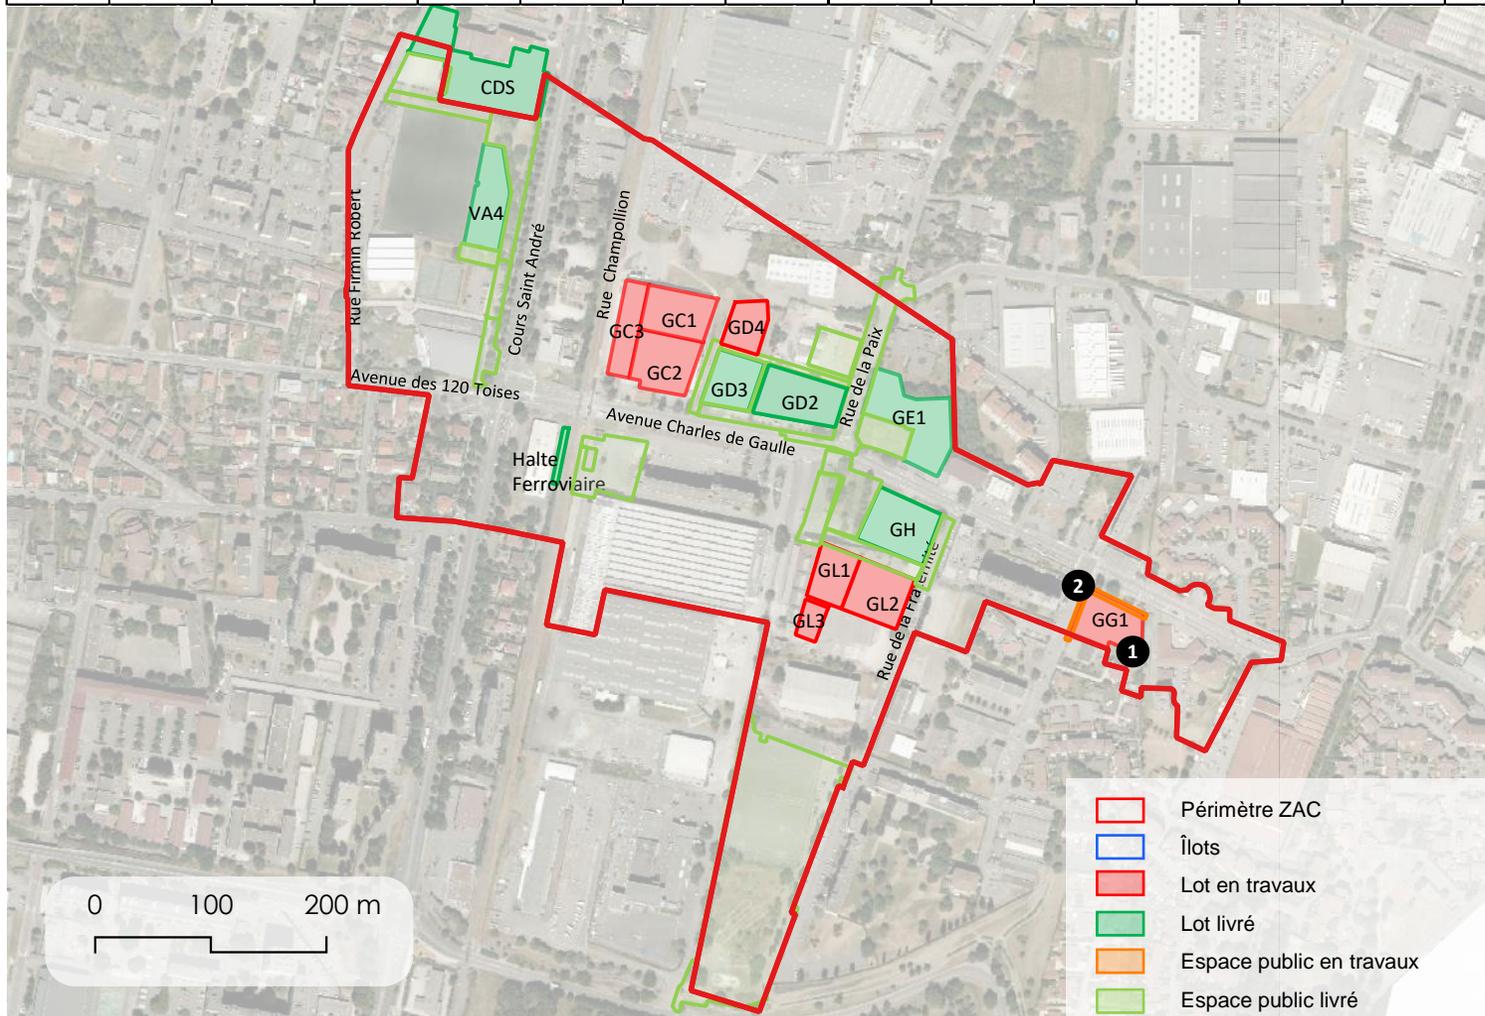

- ① Livraison du lot GG1 au T1 2026
- ② Travaux d'aménagement de la périphérie de GG1 au T1 2026

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 1

2022												2023												2024												2025												2026												2027											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

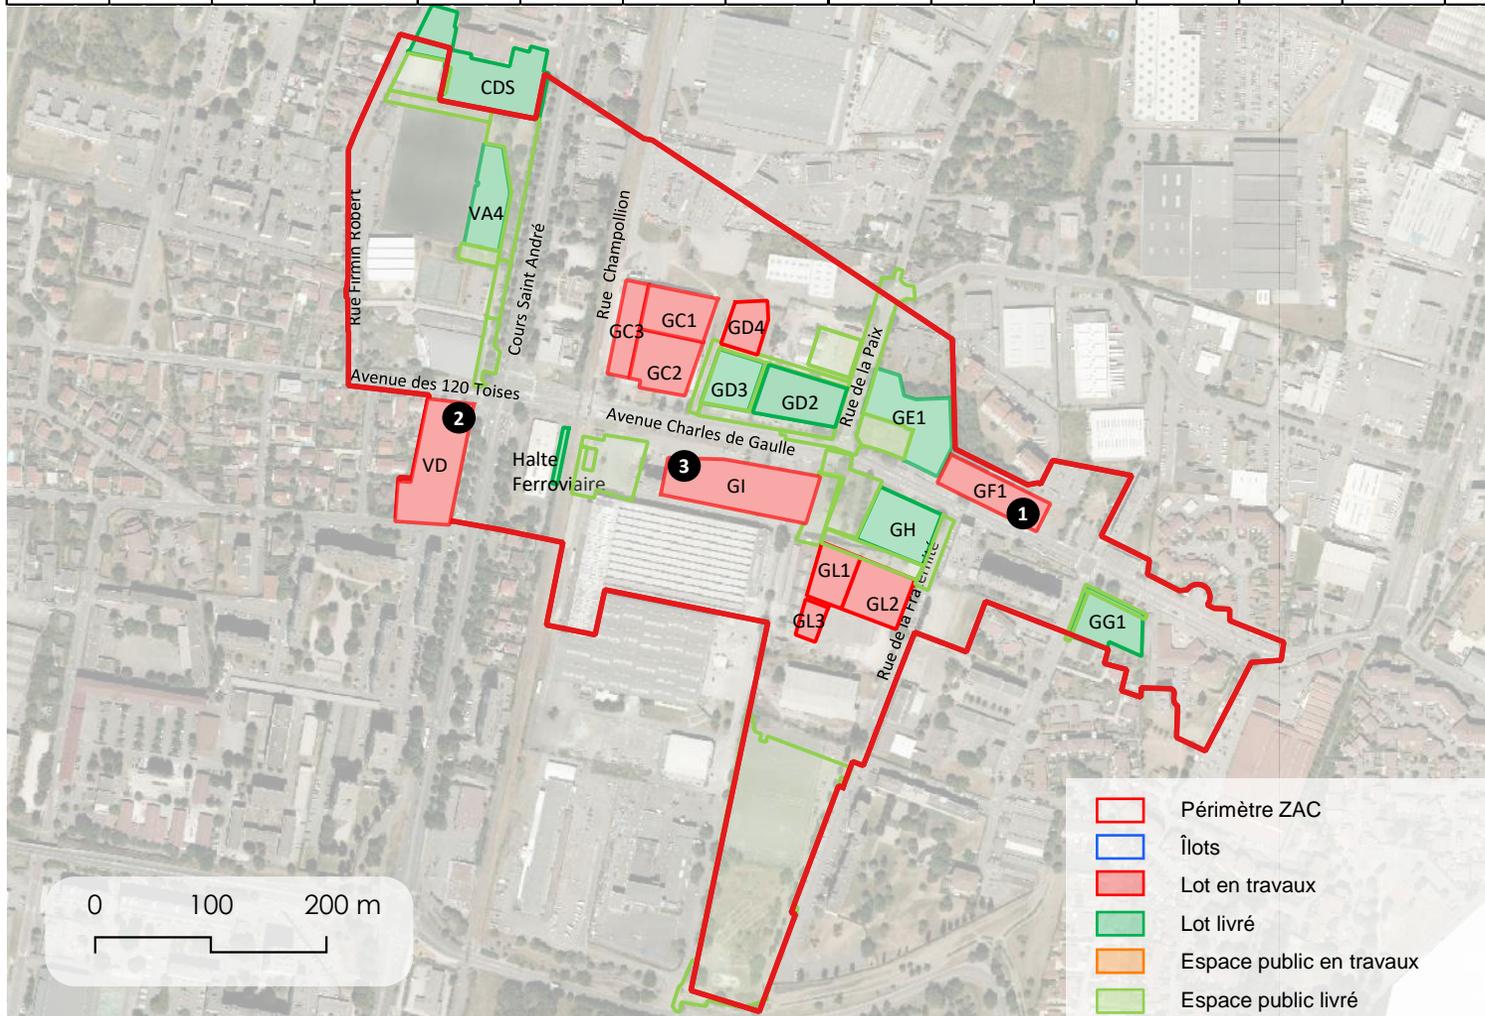


- ❶ Démarrage du lot GF1 au T3 2026
- ❷ Démarrage lot VD au T4 2026
- ❸ Démarrage lot GI au T4 2026

- Périmètre ZAC
- Îlots
- Lot en travaux
- Lot livré
- Espace public en travaux
- Espace public livré

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 2


2022					2023					2024					2025					2026					2027																						
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

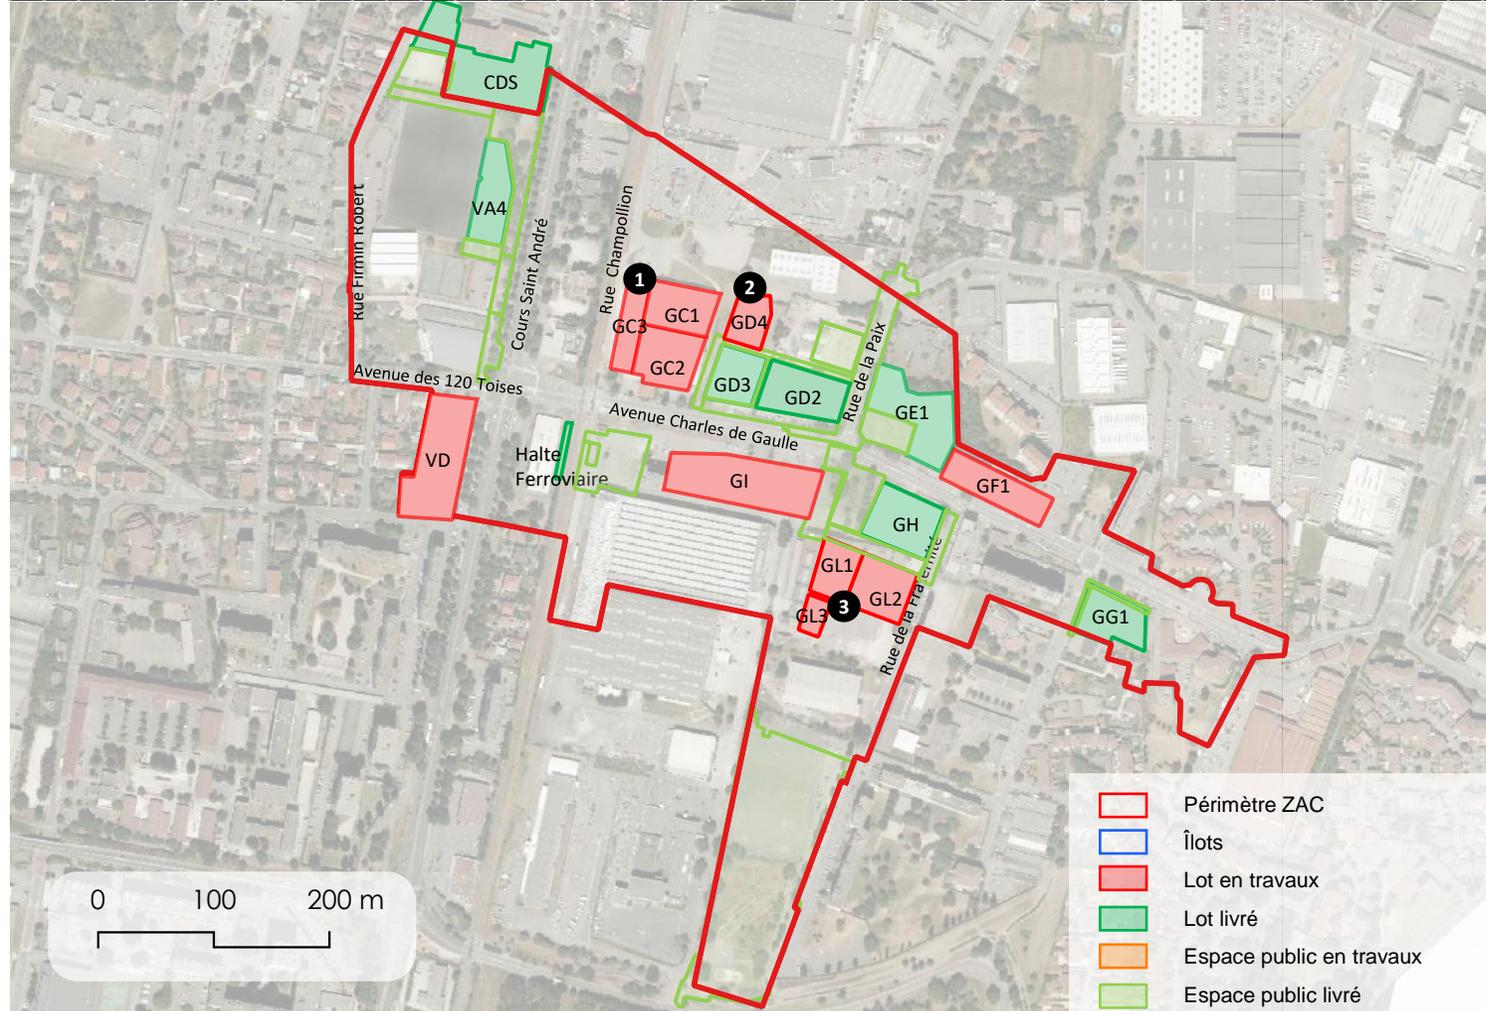

- ❶ Livraison lot GC en 2027
- ❷ Livraison lot GD4 en 2027
- ❸ Livraison lot GL en 2027

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 2


2027

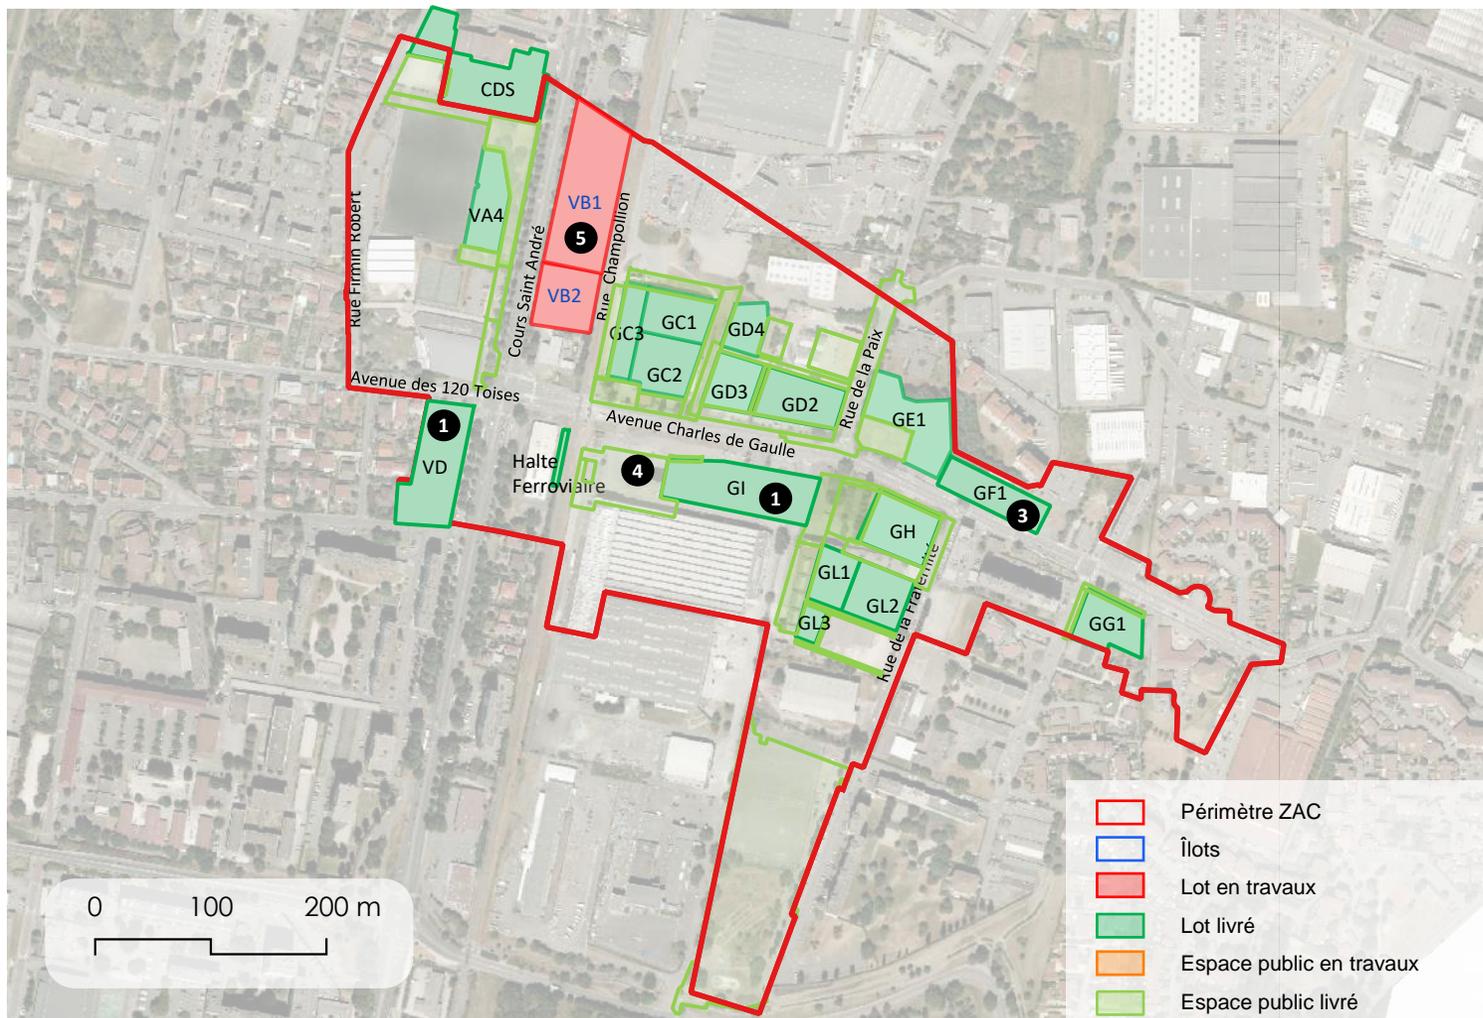

- 1 Livraison du lot GI
- 2 Livraison du lot VD
- 3 Livraison du lot GF1 A B C
- 4 Livraison partie est Place Mitterrand
- 5 Démarrage Travaux VB1 / VB2

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 2

2028

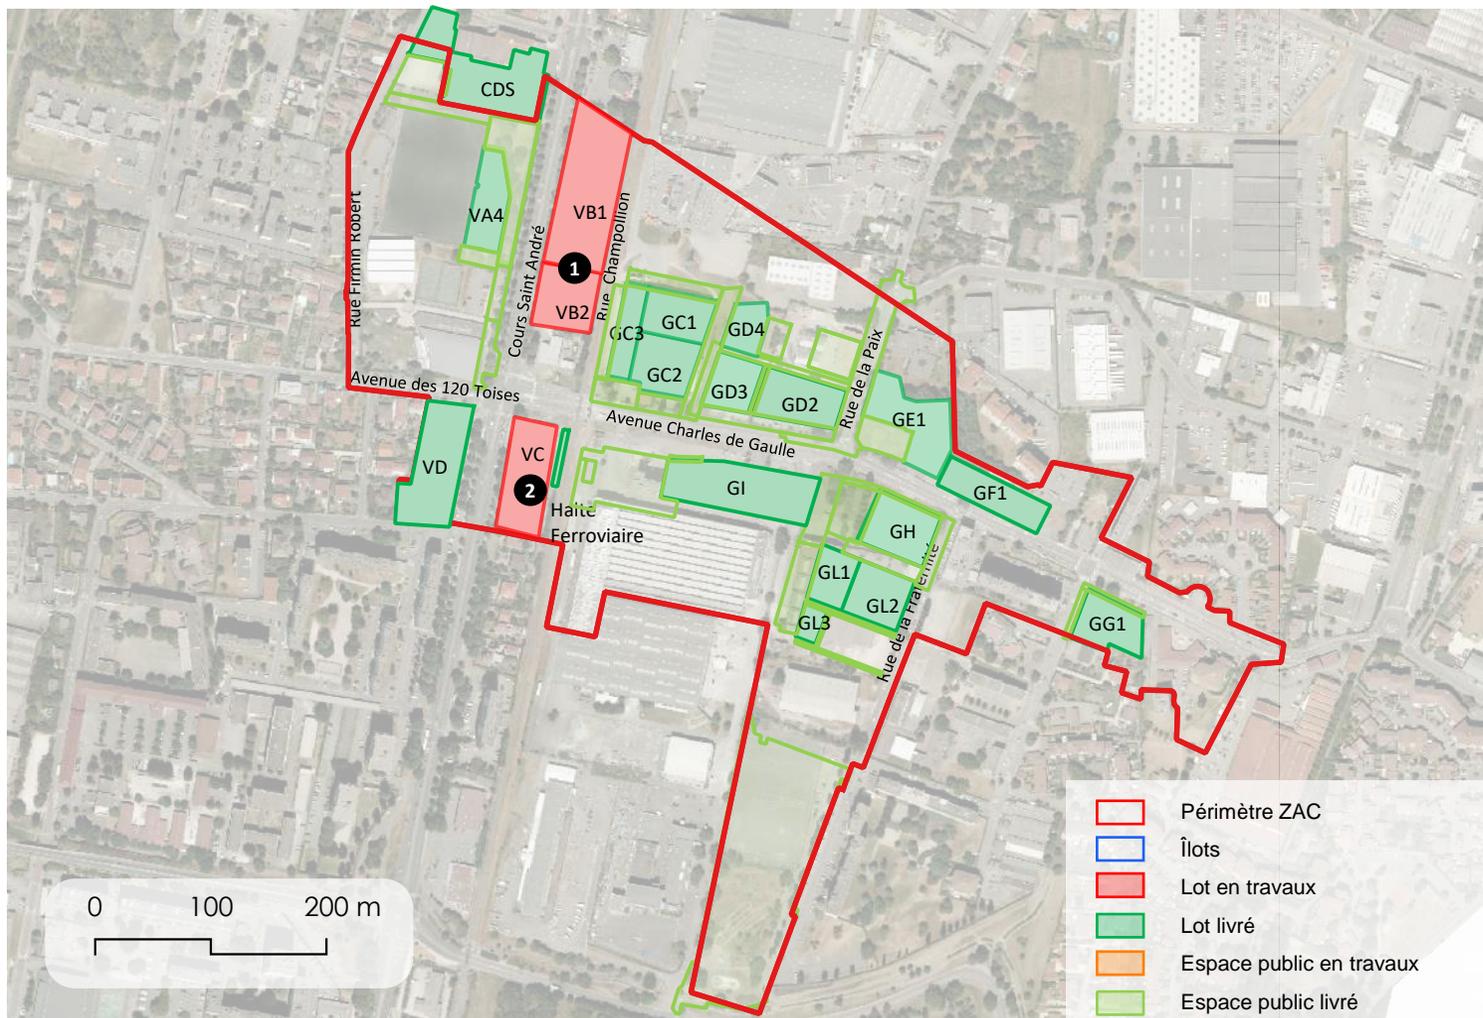


① Travaux VB1 / VB2

② Démarrage Travaux Parking Silo VC

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 2


2029

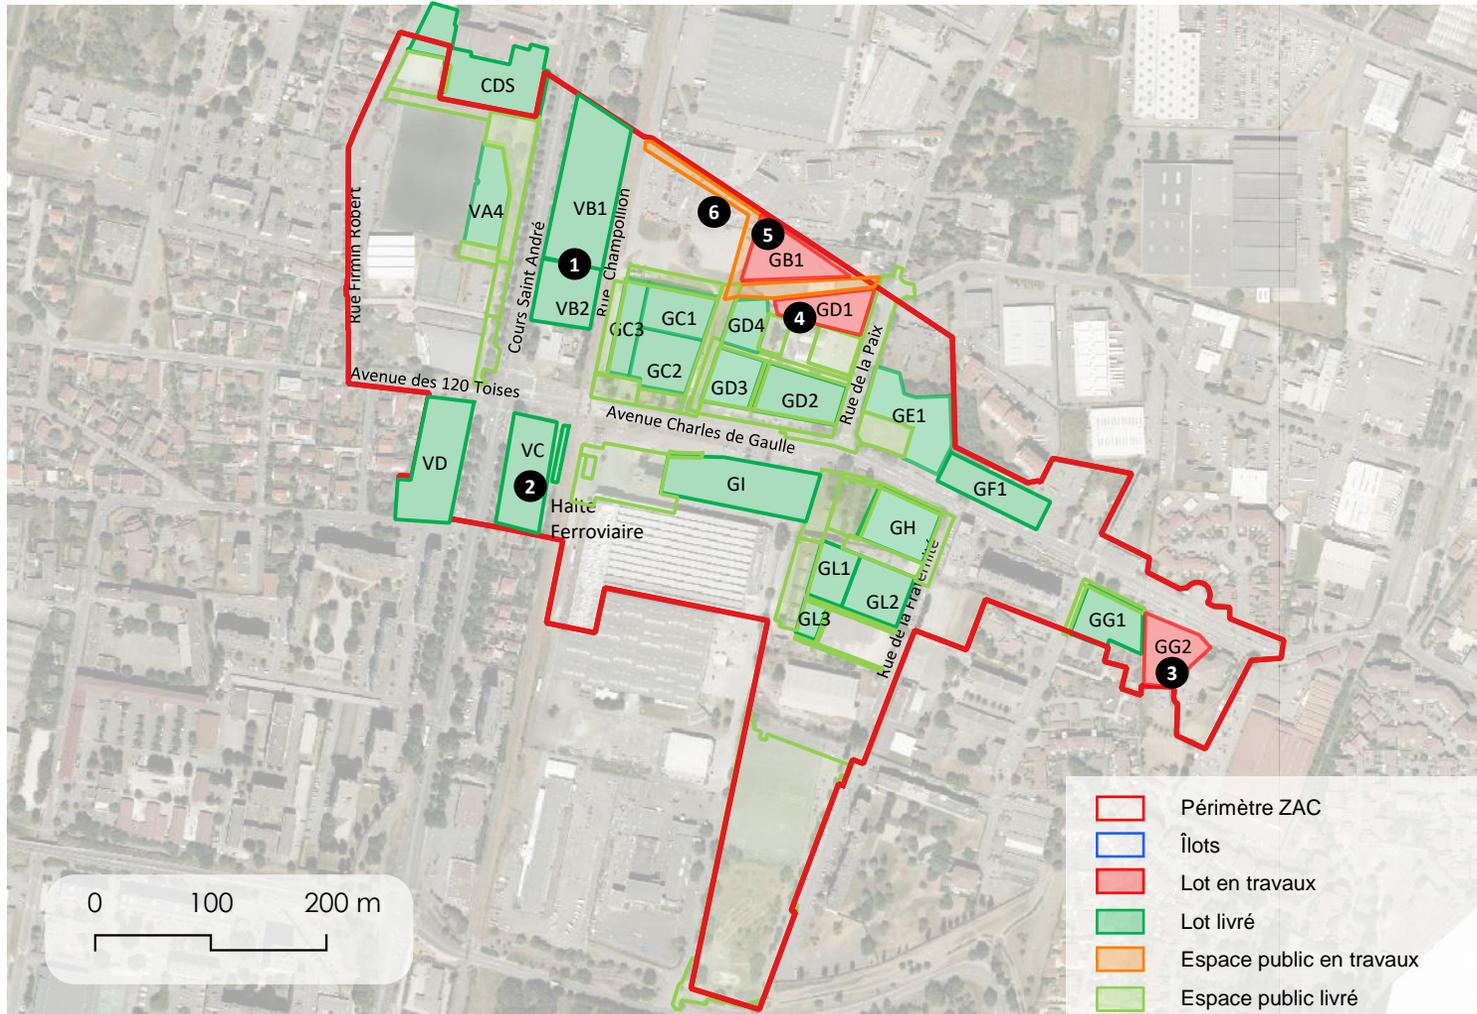

- 1 Livraison VB1 / VB2
- 2 Livraison Parking Silo VC
- 3 Démarrage Travaux GG2
- 4 Démarrage Travaux GD1
- 5 Démarrage Travaux GB1
- 6 Travaux voirie Ferdinand Buisson et Stanislas Dwojakowski

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 2


2030

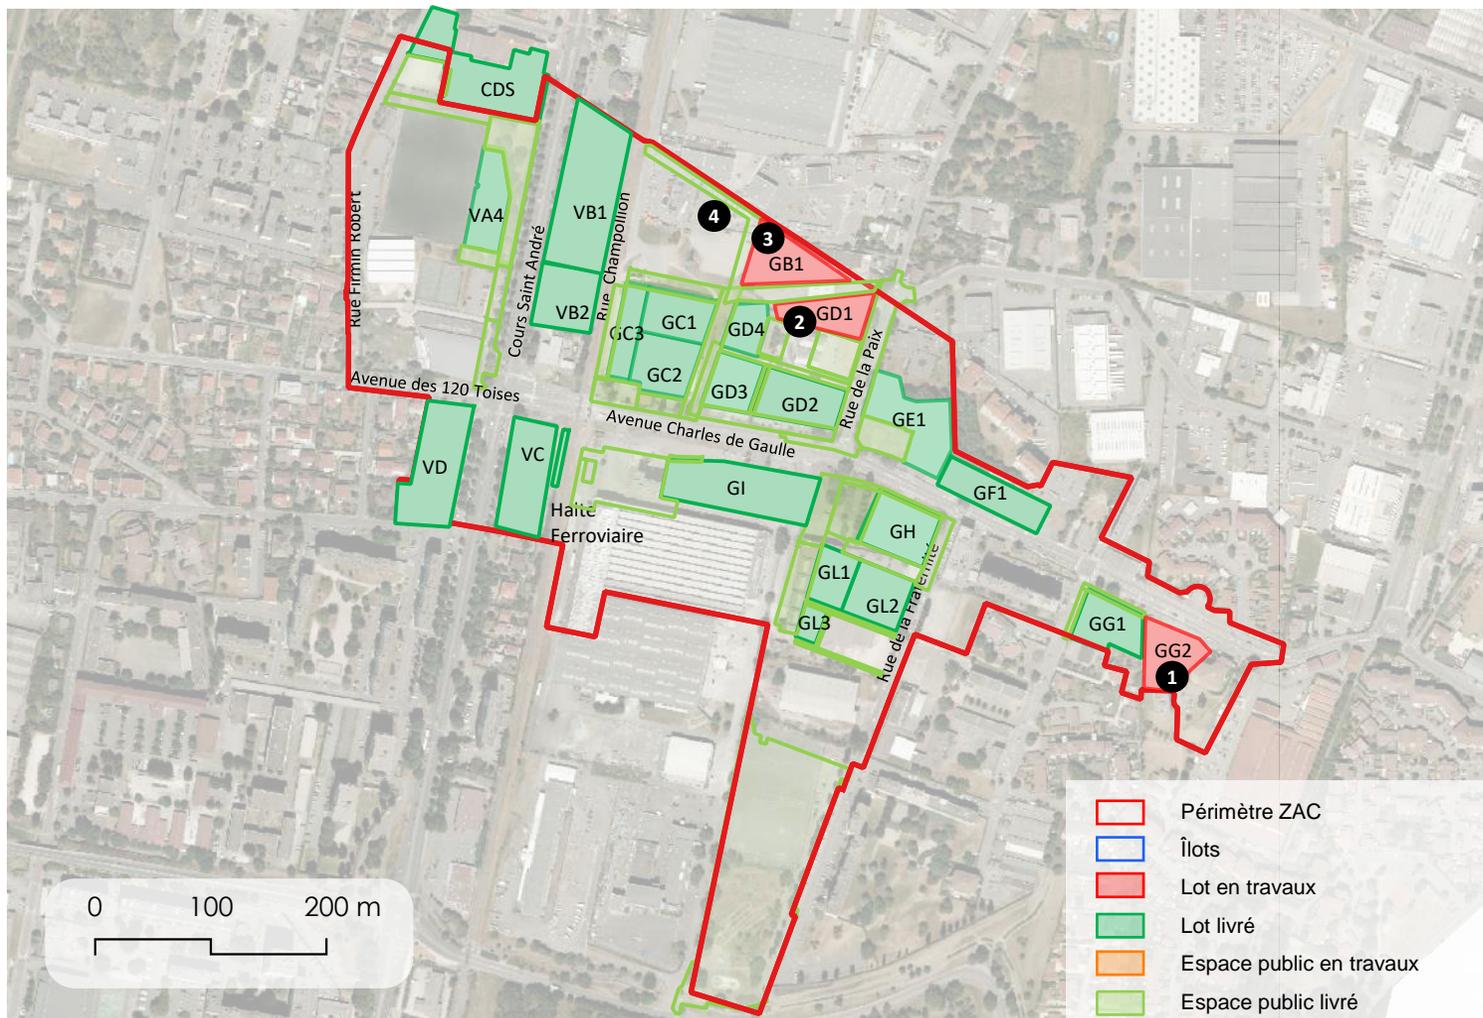

- 1 Travaux GG2
- 2 Travaux GD1
- 3 Travaux GB1
- 4 Livraison voirie Ferdinand Buisson et Stanislas Dwojakowski

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 2


2031

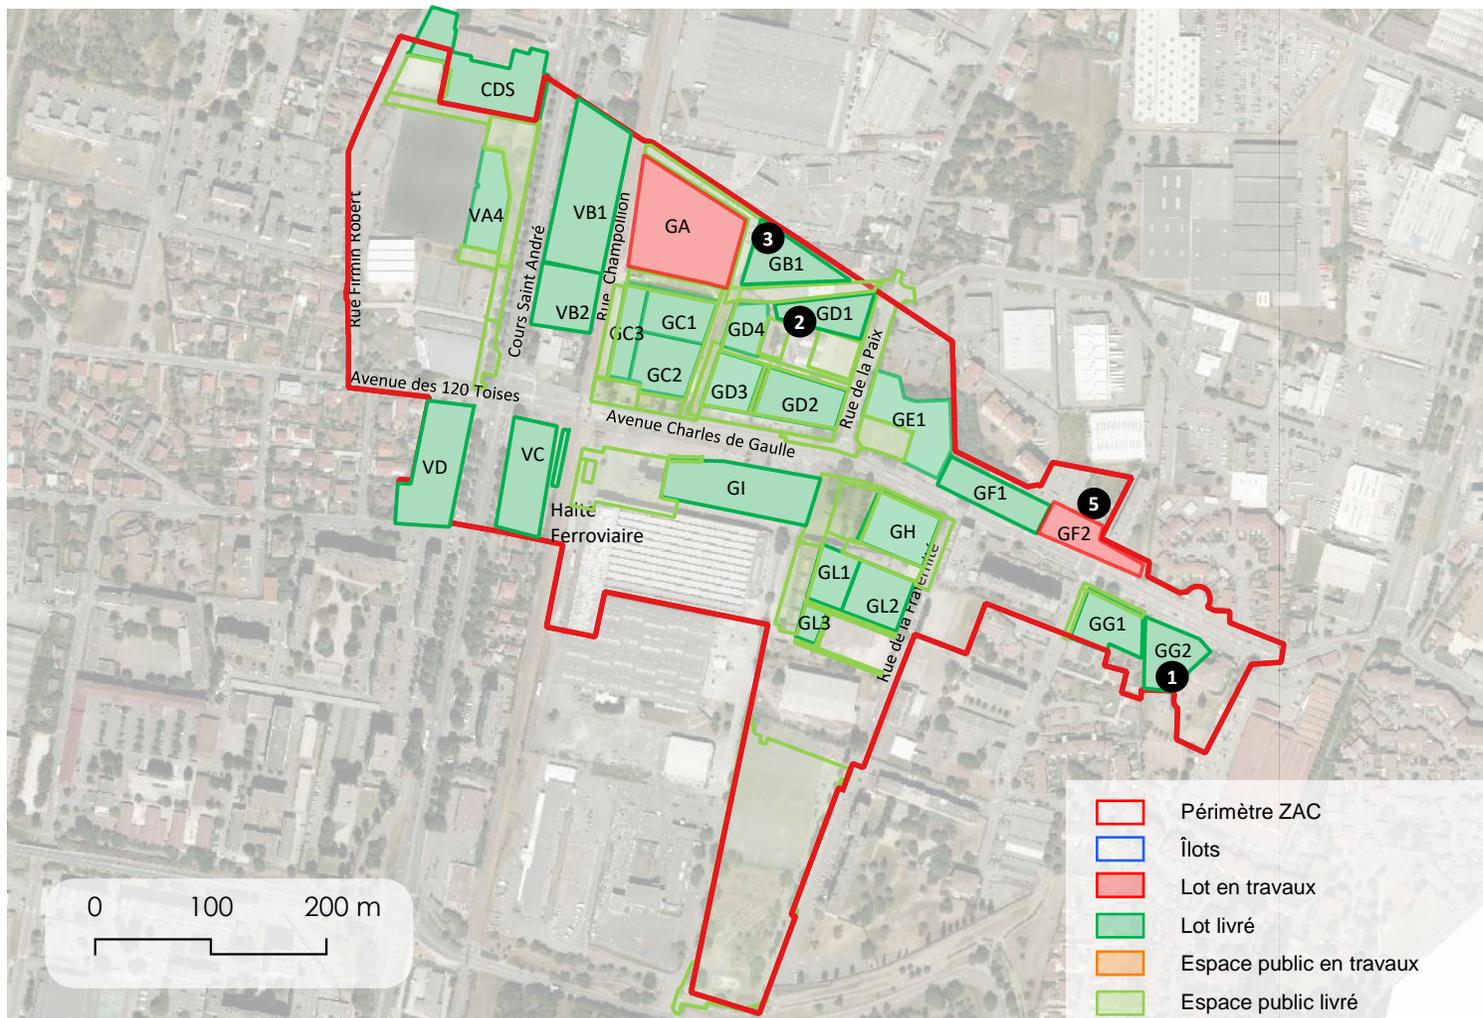

- 1 Livraison GG2
- 2 Livraison GD1
- 3 Livraison GB1
- 4 Démarrage Travaux Ilot GA
- 5 Démarrage Travaux Ilot GF2

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 3


2032

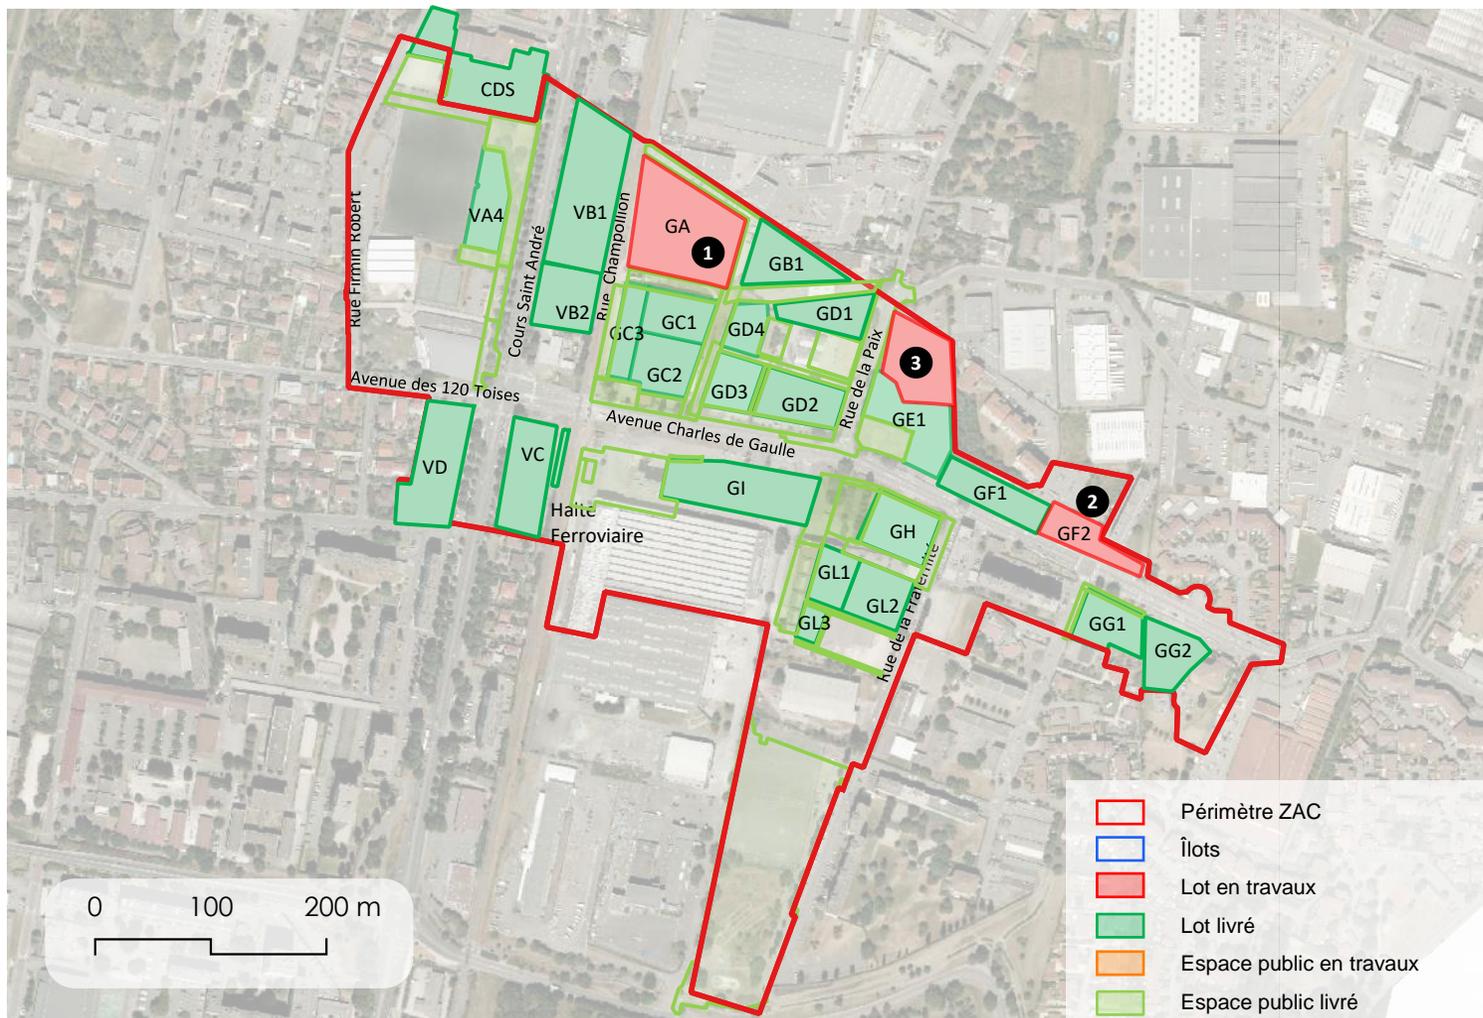

- 1 Travaux Ilot GA
- 2 Travaux Ilot GF2
- 3 Démolition ENILV

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 3


2033

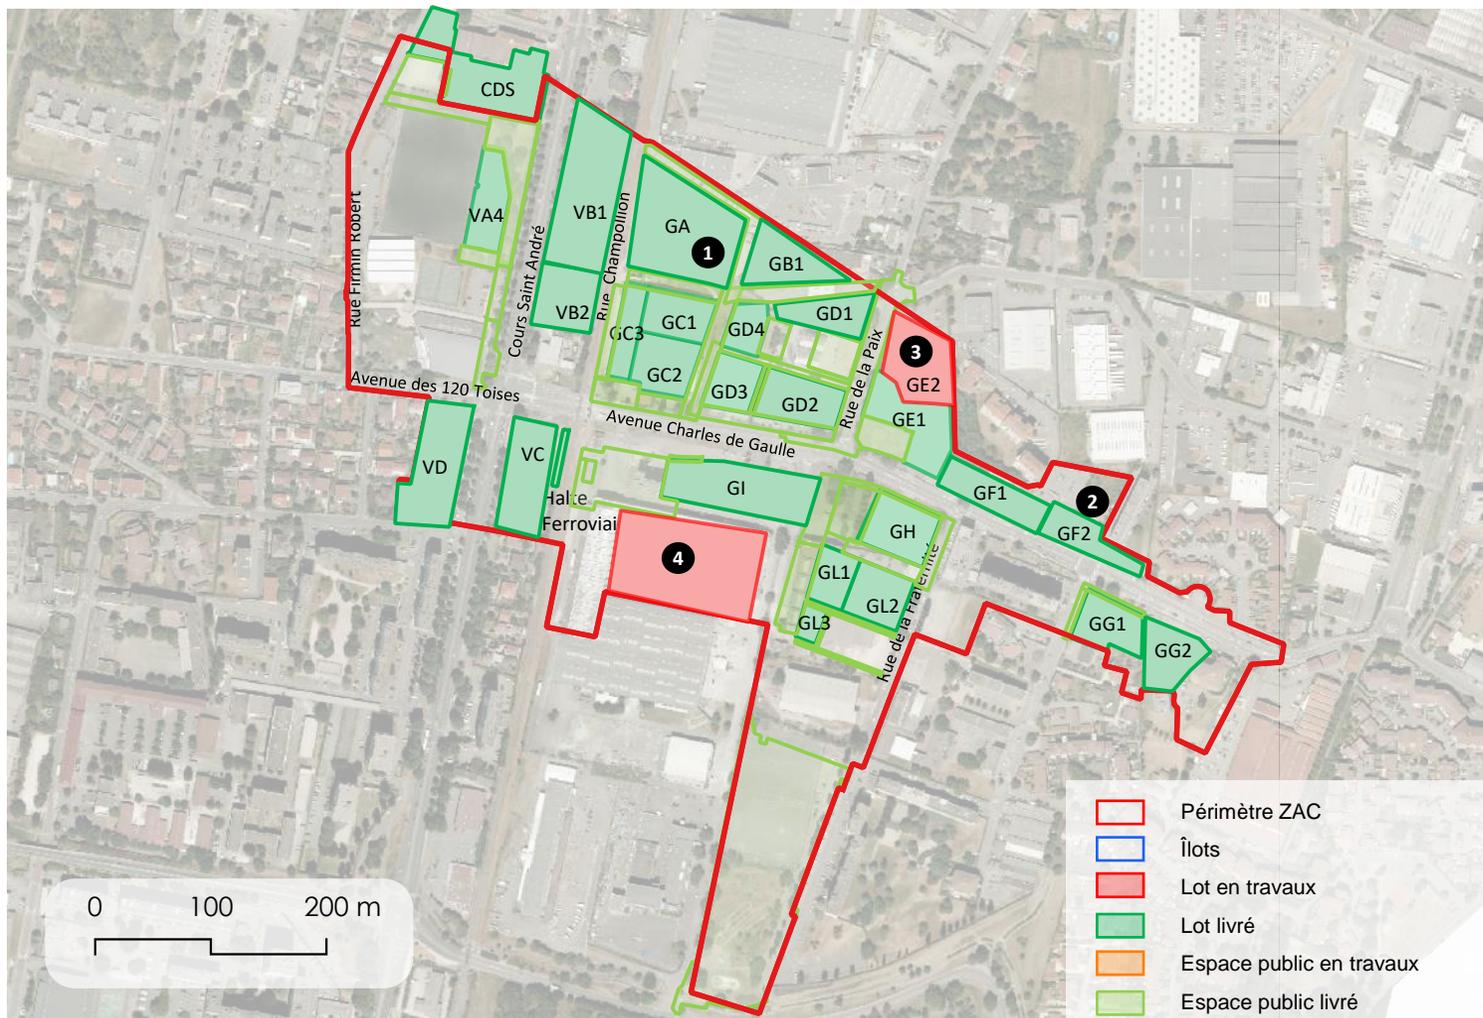

- 1 Livraison Ilot GA
- 2 Livraison Ilot GF2
- 3 Démarrage Travaux Ilot GE2
- 4 Démolition Halle GJ/GK

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 3


2034

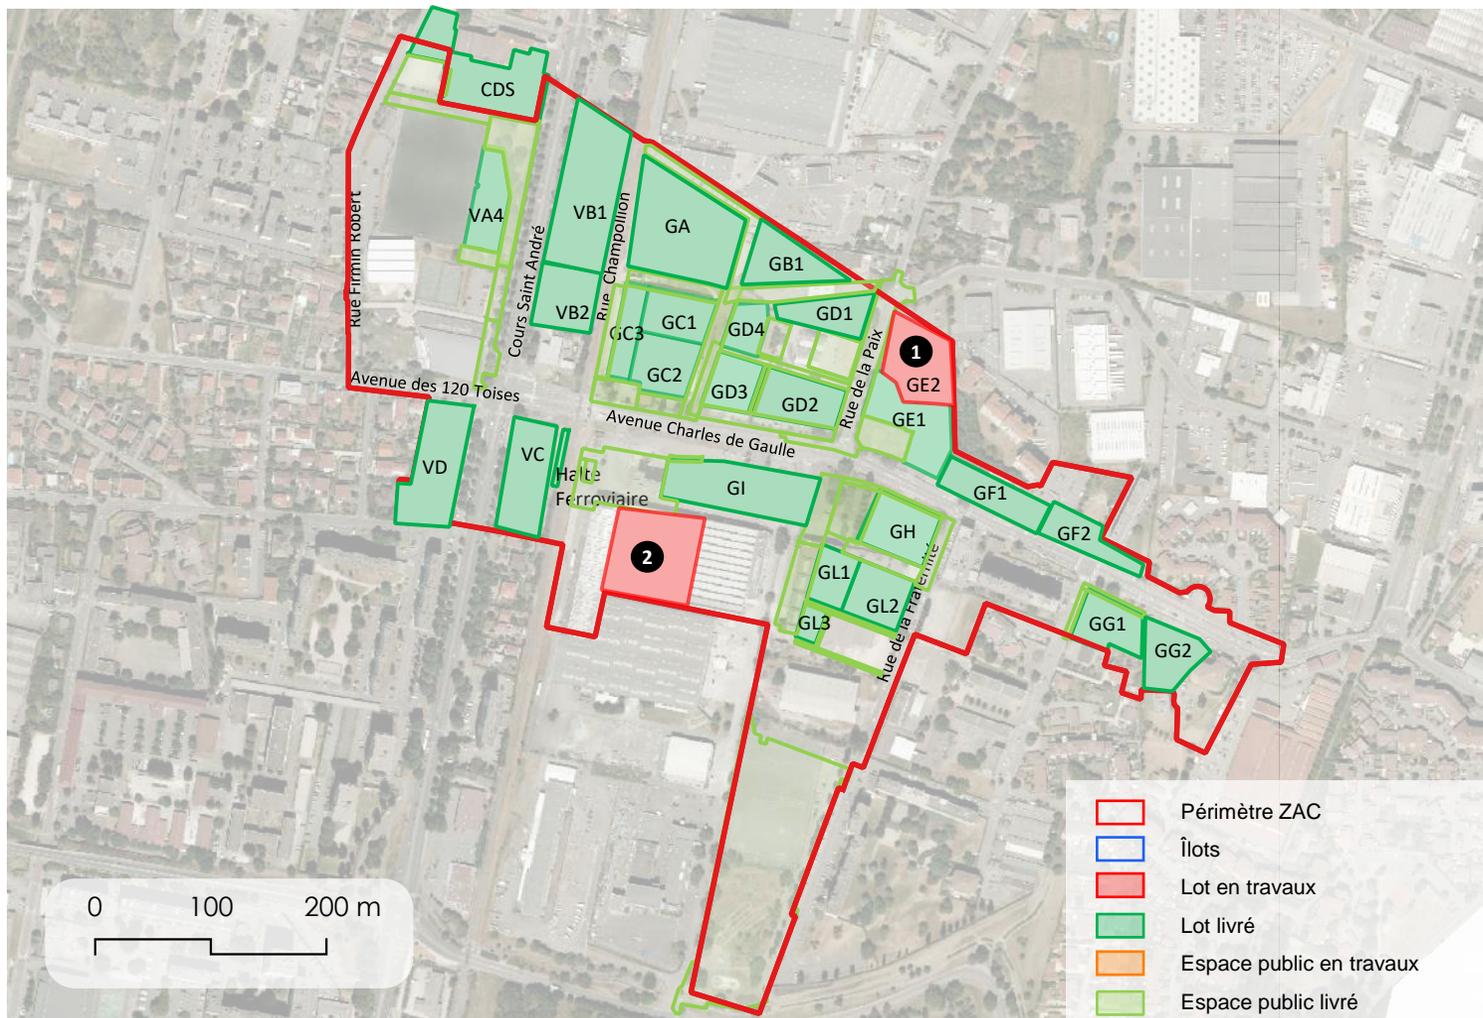


- 1 Travaux Ilot GE2
- 2 Démarrage Ilot GJ

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 3

2035

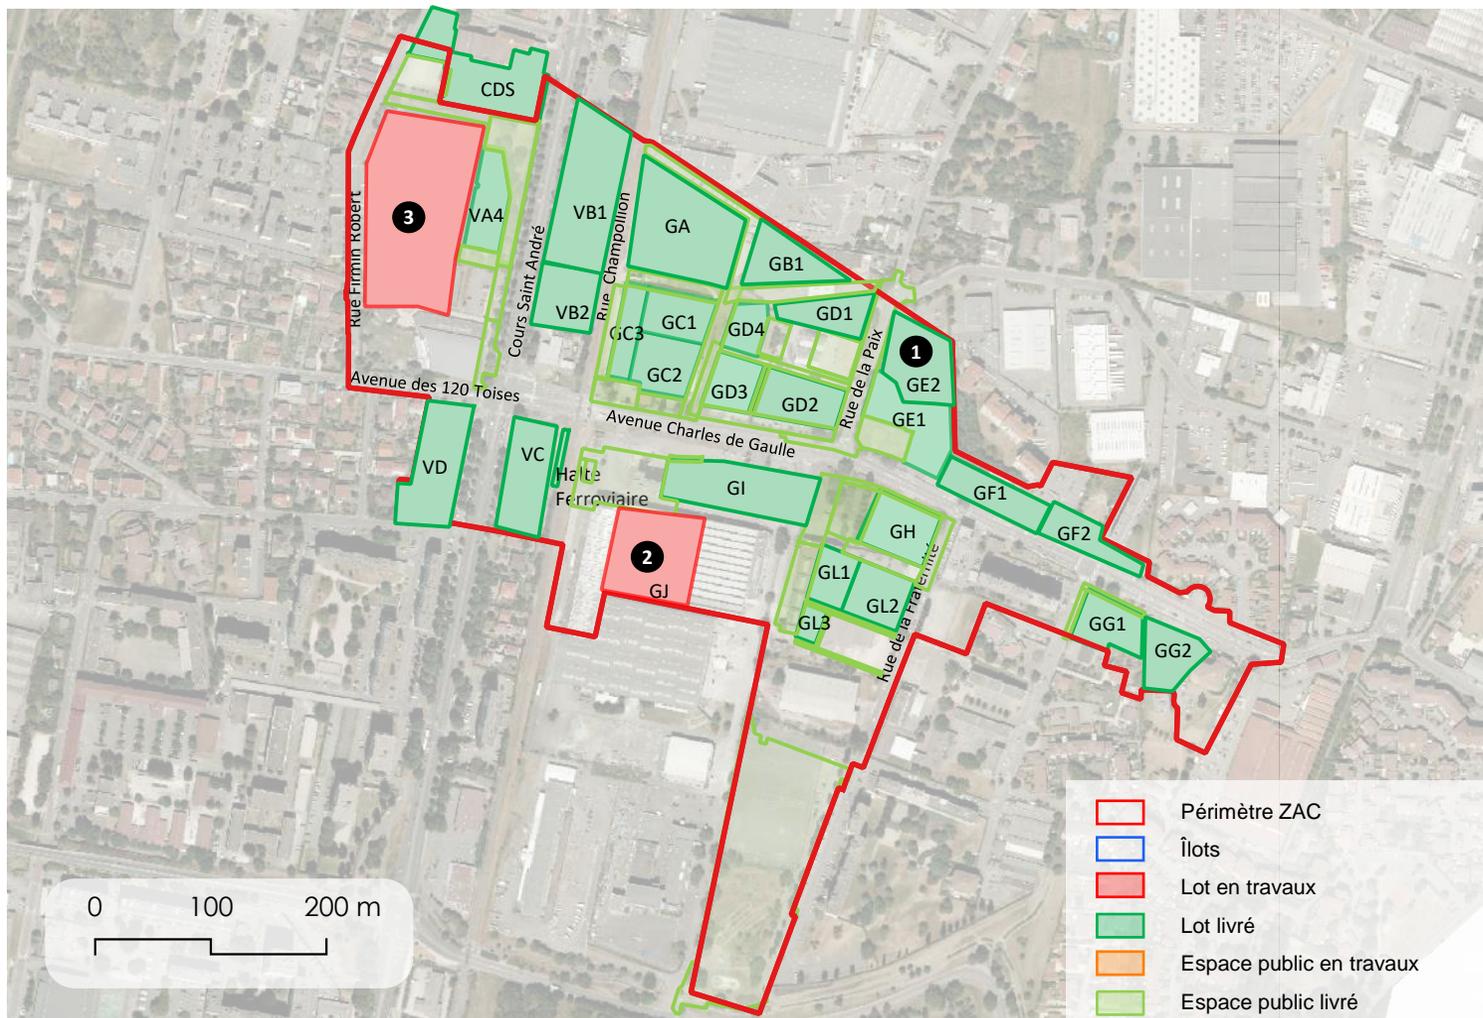


- 1 Livraison Ilot GE2
- 2 Travaux Ilot GJ
- 3 Démolition équipements sportifs ilot VA

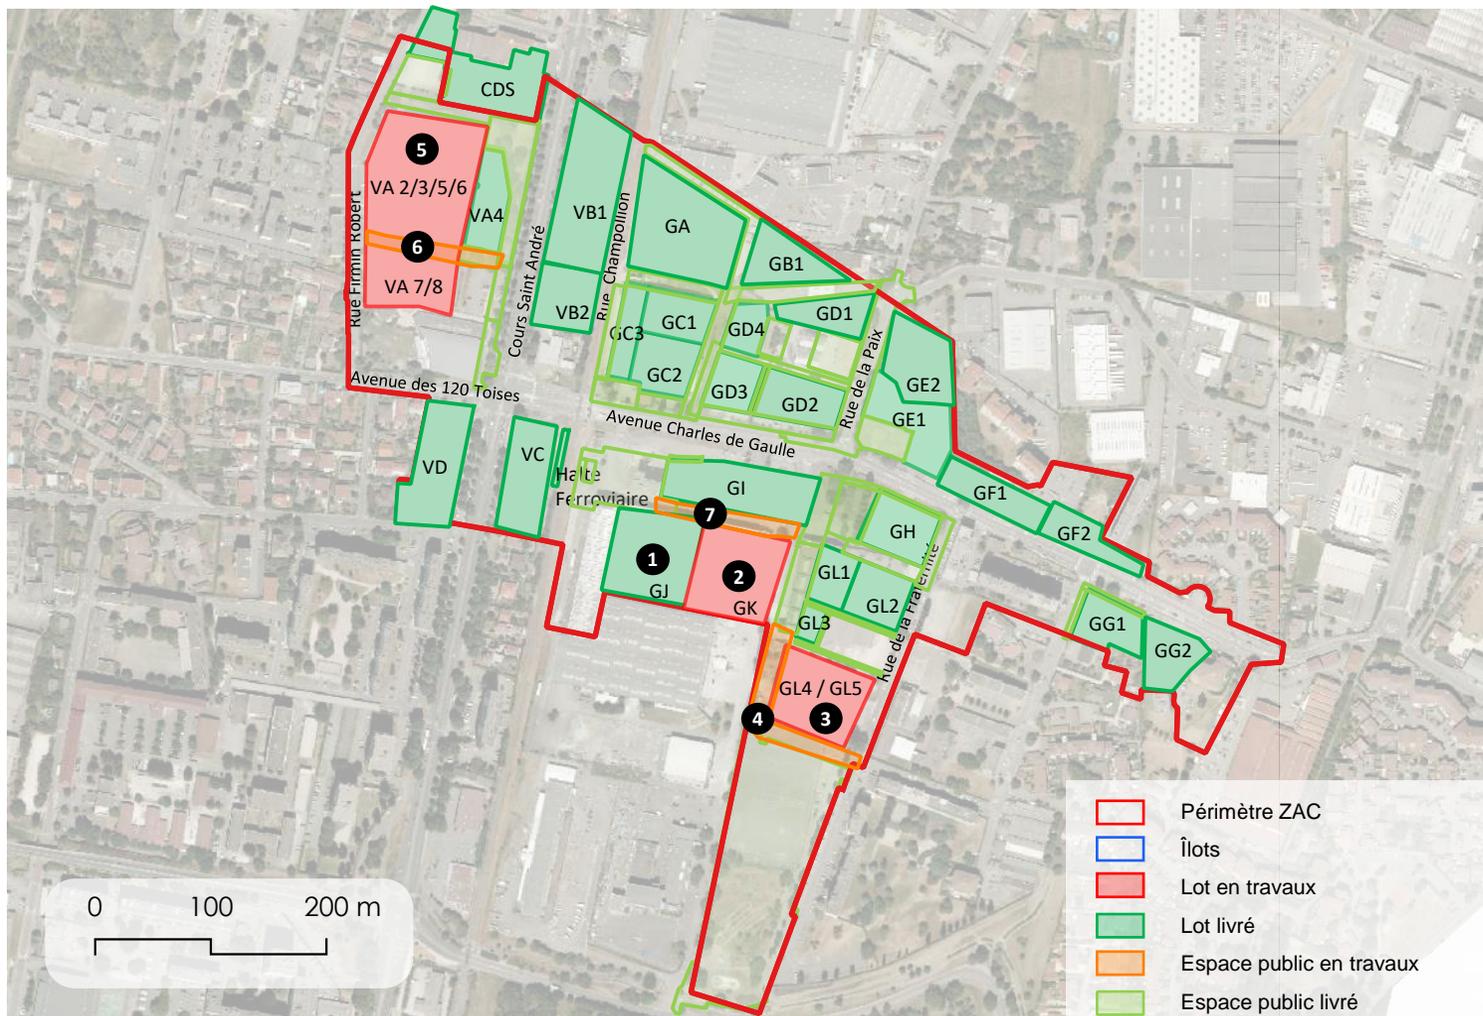

- 1 Livraison Ilot GJ
- 2 Démarrage Travaux Ilot GK
- 3 Démolition Halle GL4/GL5
- 4 Travaux Viabilisation voirie GL4 / GL5
- 5 Travaux ilot VA 2/3/5/6/7/8
- 6 Travaux voirie Louis Barbillon
- 7 Travaux voirie Marguerite Gonnet

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 3


2037

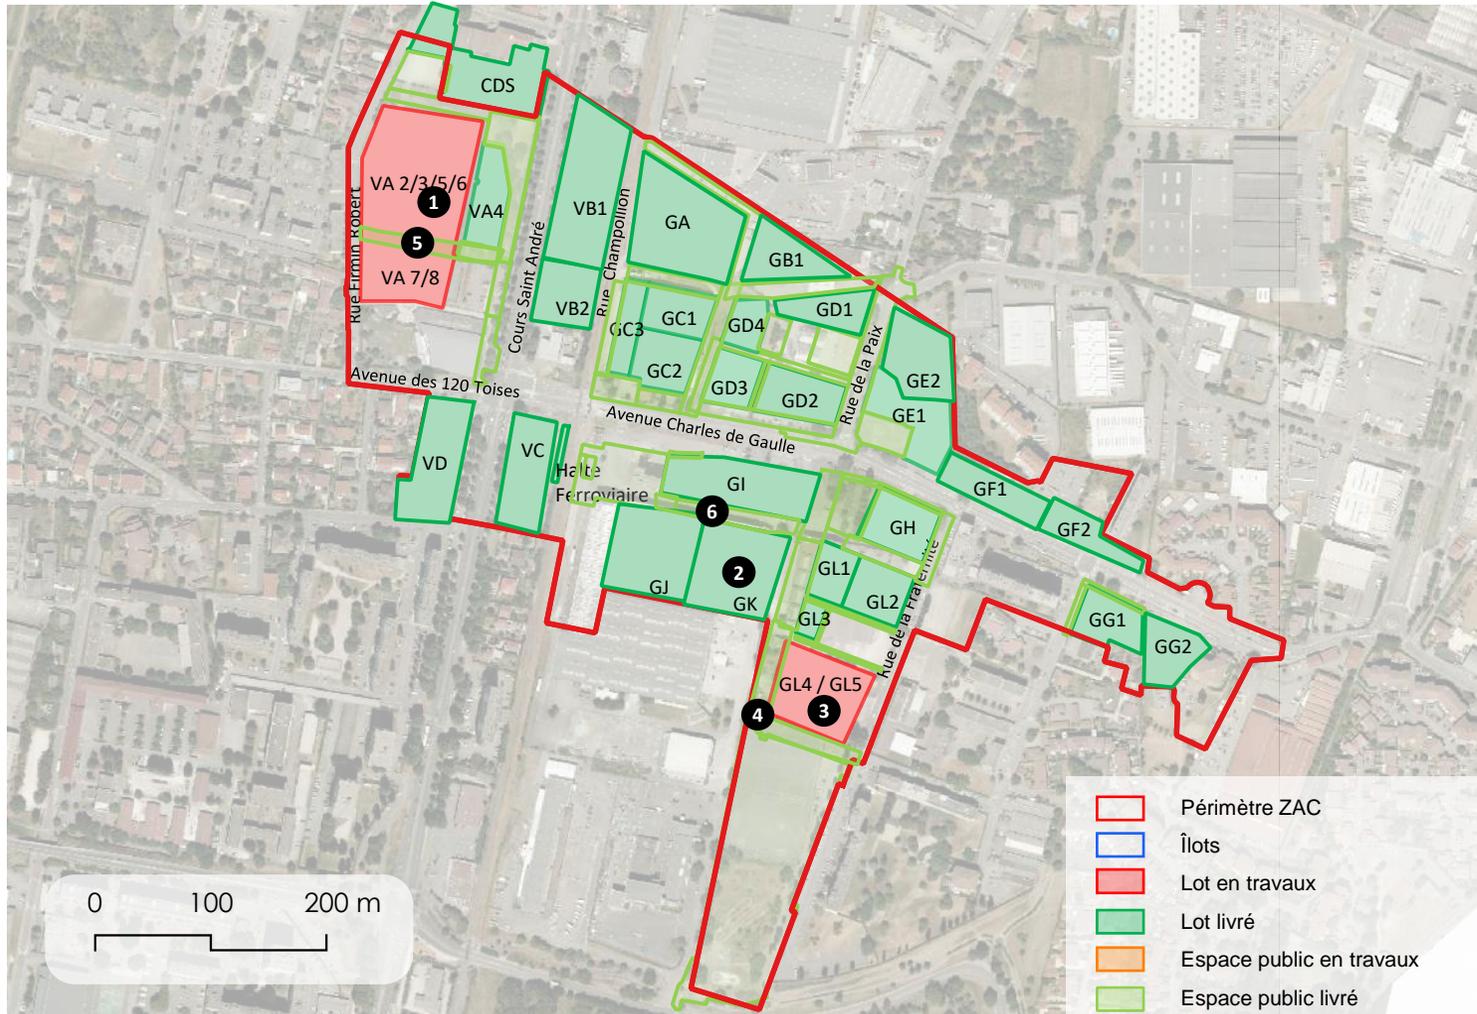

- 1 Travaux îlot VA 2/3/5/6/7/8
- 2 Livraison Îlot GK
- 3 Travaux GL4/GL5
- 4 Livraison voiries GL4 / GL5
- 5 Livraison voirie Louis Barbillon
- 6 Livraison voirie Marguerite Gonnet

PHASAGE GÉNÉRAL – TEMPS 3

POST 2037

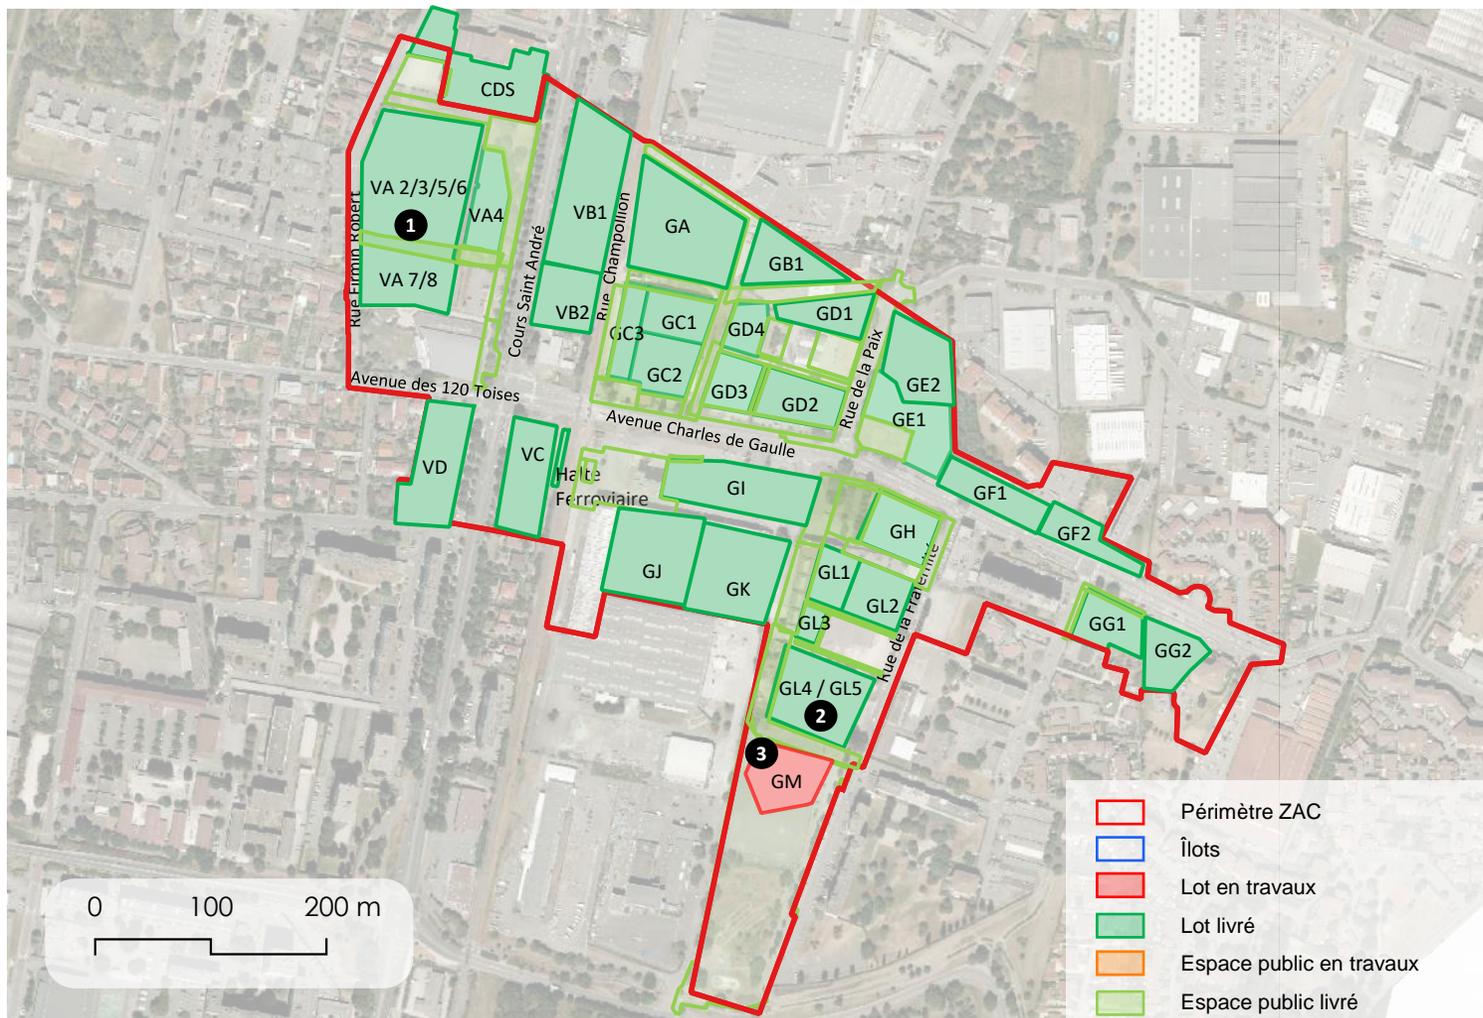

- 1 Livraison ilot VA 2/3/5/6/7/8
- 2 Livraison ilot GL4/GL5
- 3 Travaux GM
